


施工状況等報告書添付資料「対象事業の実施状況一覧表（第Ⅰ工区）」

1. 新姫川第六発電所新設工事（第Ⅰ工区）スケジュール

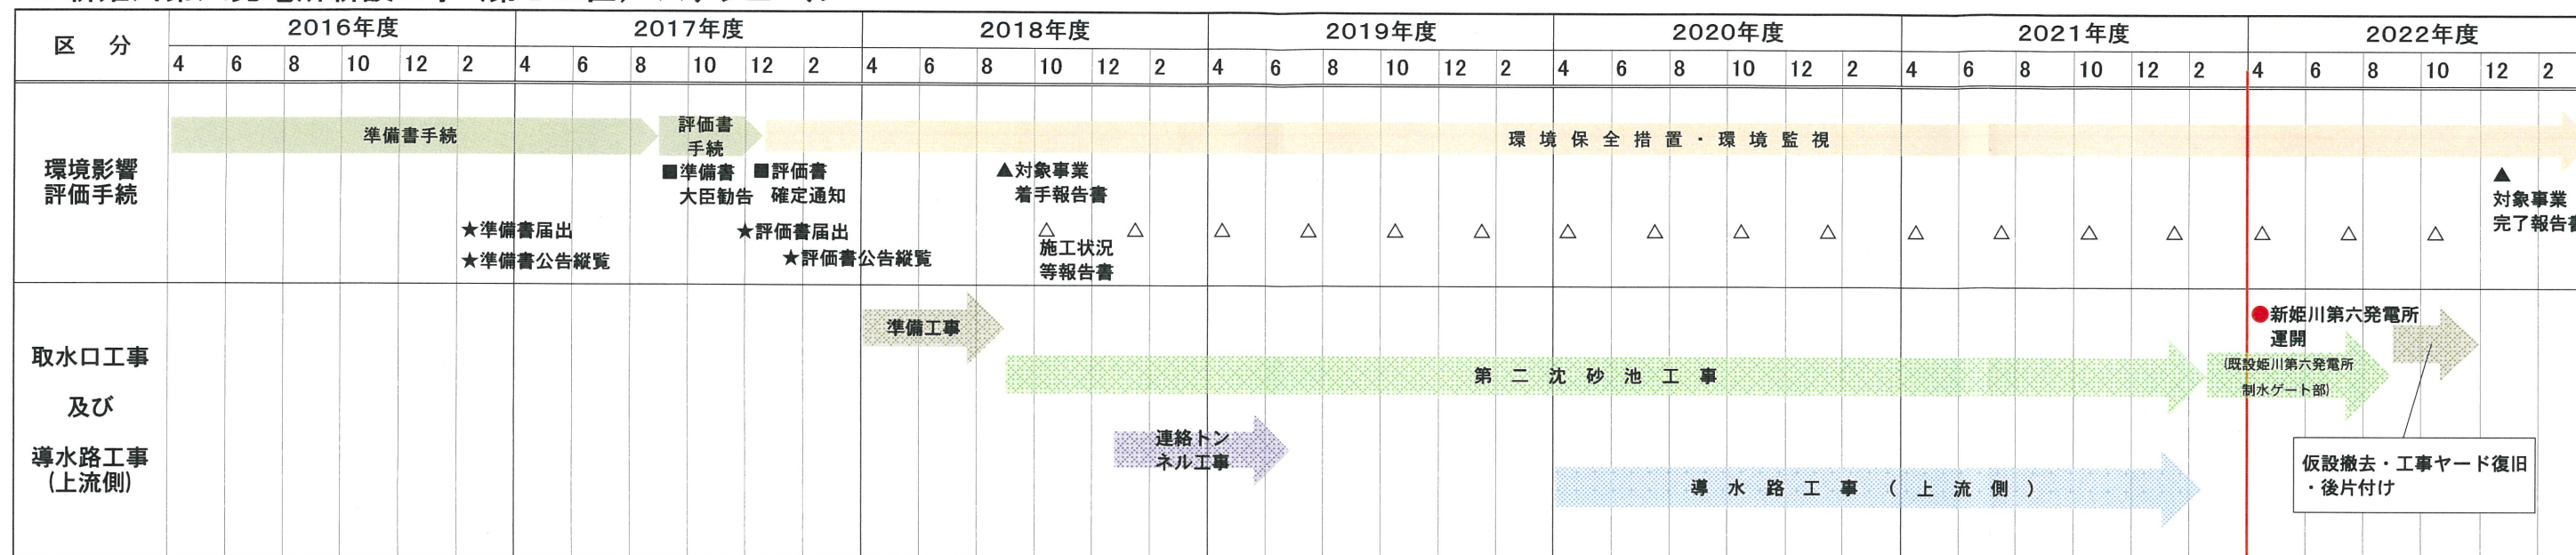

2. 対象事業の実施状況一覧（第Ⅰ工区）

年 度	2018年度				2019年度				2020年度	
	回数	第1回報告	第2回報告	第3回報告	第4回報告	第5回報告	第6回報告	第7回報告	第8回報告	第9回報告
報告対象期間	本体工事着工(8/21)～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	
実施状況	2018年8月21日より本体工事着工。工事用仮設備の上部作業構台を設置完了。第二沈砂池工事(既設開渠部拡幅工事)を実施。	2018年10月16日より10月30日まで断水工事を実施。沈砂池仮締切、仮水路を設置完了。第二沈砂池工事(既設開渠部拡幅工事)、連絡トンネル工事(準備工事)を実施。	第二沈砂池工事(既設開渠部拡幅工事)、連絡トンネル工事を実施。	連絡トンネル工事6月末完了。第二沈砂池工事(既設開渠部拡幅工事)、導水路坑口上部法面補強工事を実施。	第二沈砂池工事(既設開渠部拡幅工事)、導水路坑口上部法面掘削および補強工事を実施。	第二沈砂池川側躯体完成。仮締切切替完了(川側→山側)。使用前社内検査終了。河川法工作物一部使用承認検査終了。	第二沈砂池山側掘削、山留工、仮水路取壊し、導水路坑口上部法面補強完了。導水路掘削工事準備実施。坑口付けの後、2020年5月21日から掘削を開始し掘削実施。	導水路1号トンネル掘削工事準備(高圧受電設備、濁水処理設備、排水設備ほか)、坑口付けの後、2020年5月21日から掘削を開始し掘削実施。	導水路1号トンネル掘削を継続して実施。	
年 度	2020年度			2021年度			2022年度			
回数	第10回報告	第11回報告	第12回報告	第13回報告	第14回報告	第15回報告	第16回報告	第17回報告	第18回報告	
報告対象期間	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～11月	
実施状況	導水路1号トンネル掘削を継続して実施。	導水路1号トンネル掘削を3月に完了(トンネル貫通)。軌条撤去、掘削機械の整備・撤去を実施。第二沈砂池仮設棧橋一部撤去を実施。	導水路1号トンネルのレール撤去および中央排水を設置、第二沈砂池の山側掘削および仮設棧橋の一部撤去を完了。導水路1号トンネルの防水シート設置および覆工、第二沈砂池の躯体構築を実施。	導水路1号トンネルの防水シート設置および覆工、第二沈砂池山側の躯体構築を継続して実施。	導水路1号トンネルの防水シート設置および覆工の施工完了。第二沈砂池山側の躯体構築を継続して実施。	第二沈砂池山側躯体構築。仮締切切替後、通水・有水試験実施。姫六(既設)沈砂池制水ゲート部掘削・坑口上部法面補強を実施。	4/5新姫川第六発電所運開、第二沈砂池山側運用開始。姫六沈砂池制水ゲート(既設)部掘削・構築を実施。	姫六沈砂池制水ゲート(既設)部構築および新姫六沈砂池制水ゲート(新設)部と共通の上屋を構築。仮締切撤去、姫川第六発電所(既設)の取水再開。仮設構築物および工事ヤードの復旧を実施中。		

施工状況等報告書添付資料「現況写真(第I工区)」



全景(川側より)

撮影日:2022年9月22日



第二沈砂池施工状況 (上流より)

撮影日:2022年9月6日

第二沈砂池上屋
施工状況(上流より)



第二沈砂池上屋

新姫六沈砂池
制水ゲート(新設)

姫六沈砂池
制水ゲート(既設)

撮影日:2022年9月6日

第二沈砂池(山側)
施工状況(下流より)



第二砂池
(山側)

←川側

山側→

撮影日:2022年9月8日

施工状況等報告書添付資料「環境保全措置実施状況一覧表（第Ⅰ工区）」

期間：2022年7月1日～2022年9月30日

【水環境】

影響要因	影響要素	環境保全措置の内容	環境保全措置の実施状況
造成等の施工による一時的な影響	水の濁り	濁水処理装置による水の濁りの適正処理	施工による濁水は、濁水処理装置を経由して沈殿後の上澄み水を放流している。なお、第二沈砂池施工完了により今後は濁水の発生が無くなったことから、濁水処理装置は撤去している。
		排水水質の管理	濁水処理装置出口における排水の浮遊物質量が、25mg/L以下となるよう濁度計を用いて管理している。
	水素イオン濃度	濁水処理装置による水素イオン濃度の適正処理	発生した濁水は濁水処理装置を経由し、液化炭酸ガスにて中和し、PH調整をした後、放流している。
		排水水質の管理	濁水処理装置出口における排水の水素イオン濃度を、6.5以上8.5以下となるよう管理している。
	地下水水質	濁水処理装置による処理	1号トンネル通水後は、湧水は発生していない。
		トンネル排水水質の監視	調査で地下水水質に異常が無いことを確認している。

【大気環境（建設機械の稼働に伴う騒音、振動）】

影響要因	影響要素	環境保全措置の内容	環境保全措置の実施状況
建設機械の稼働	騒音・振動	工事量の平準化	工事計画策定段階において、工事量を平準化し、ピーク時の建設機械稼働台数の低減を図る工程とし、工事を実施中である。
		建設機械の効率的な使用	工事規模に合わせ、建設機械等を適正に配置し、効率的な使用を行っている。
		資機材の工場組立	仮設鋼材等は可能な限り工場組立とし、現地での施工機械使用の低減に努めている。
		低騒音、低振動型建設機械の使用	現在、工事で使用しているバックホウ・発電機等は、低騒音・低振動型である。

影響要因	影響要素	環境保全措置の内容	環境保全措置の実施状況
建設機械の稼働	騒音・振動	夜間工事の抑制	導水路工事や断水工事等を除き、原則として夜間工事を行わないこととしている。
		建設機械の性能維持	建設機械は、常に点検整備された状態を維持している。
		環境保全措置の工事関係者への周知徹底	定例会議等にて、環境保全措置を工事関係者へ周知徹底している。

【動物・生態系】

影響要因	影響要素	環境保全措置の内容	環境保全措置の実施状況
建設機械の稼働、造成等の一時的な影響	生息環境・生育環境の保全	地形改変の最小化 伐採面積の最小化	既設設備を有効活用することにより、地形改変の最小化、伐採面積の最小化を図っている。
		河川維持流量の放流	適正な河川維持流量 (1.63m ³ /s) を放流している。
		工事排水の適切な処理	濁水処理装置を経由して処理を行っている。
		低騒音、低振動型建設機械の使用	現在、工事で使用しているバックホウ・発電機等は、低騒音・低振動型である。
		夜間搬出入の制限	導水路工事や断水工事等を除き、原則として夜間工事を行わないこととしている。
		工事着手前に猛禽類（サシバ）の繁殖行動の有無を調査し、営巣木が現況よりも工事区域に近づき、影響が予測される場合にはコンディショニングを実施する	4月、5月の定例調査において既知の営巣林・営巣木で繁殖を確認しており、今年度調査は終了としている。
		資機材、仮設建物の早期撤去	工事に使用する資機材、仮設建物は、必要に応じ適時配置し、工事終了後は速やかに撤去する計画としている。
		工事関係車両の走行速度の注意喚起 工事関係者の立ち入り制限・動物保護の指導徹底 環境保全措置の工事関係者への周知徹底	定例会議等にて、環境保全措置を工事関係者へ周知徹底している。
