

紫外線処理装置について（3）

はじめに

第3回目となる今回は、工事の進み具合についてお知らせします。

工事の分割発注

工事は、内容毎に下記の5工区に分割して専門工事業者に施工をお願いします。

紫外線処理装置造成工事：装置を設置する紫外線処理棟を築造するための土地の造成工事

紫外線処理装置設置工事：紫外線処理棟を築造し、装置を設置する建築工事

紫外線処理装置配管工事：井戸水を処理装置経由で着水井へ送水するための配管工事

紫外線処理装置電気設備工事：装置を動かしたり照明のための電気設備工事

紫外線処理装置外構工事：紫外線処理棟周りの舗装や外灯・フェンス設置等の外構工事

は工事が完了し、現在、着水井の配管と浄水池の造成が施工中です。これらが完了してから外構工事に着手する予定です。

工事の進み具合

事務所入口門扉から見た状況

着水井(南側)から見た状況

浄水池北(東側)から見た状況




平成23(2011)年7月6日：造成工事が完了して建築工事、配管工事に着手する前の状況です。



平成23(2011)年8月3日：紫外線処理棟の壁や柱の鉄筋を組み立てている状況です。



平成23(2011)年9月1日：紫外線処理棟の地下部分の壁や梁まででき上がりました。

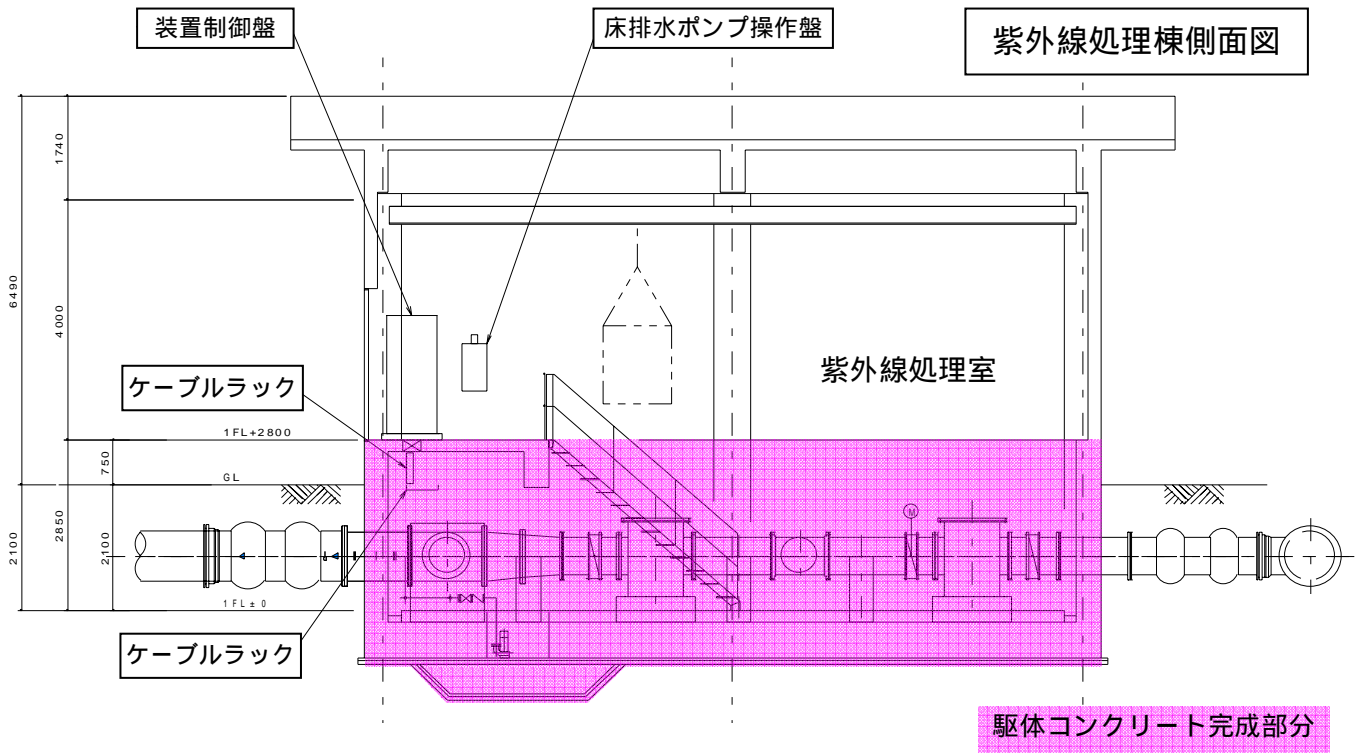

現地での工事と並行して紫外線処理装置や水道管、電気設備などを各工場で作成しており、それぞれの工程に合わせて現地に搬入する予定です。
