



伊那新校（仮称）建設工事（第一期） 9月度工事月次報告書

◆設計・工事監理 暮らしと建築社・みかんぐみ共同企業体 ◆建築工事 (株)ヤマウラ ◆電力・弱電設備工事 (株)林電機 ◆空調・衛生設備工事 (株)シノダ設備

Schedule

工種 / 月	2026年												2027年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
基礎躯体工事																								
外構工事																								
木工事																								
屋根・外壁工事																								
内装工事																								
合宿所改修																								
部室・渡り廊下																								



伊那新校（仮称）建設工事（第一期）コア部分の2階層組立てを行っています。

西棟は鉄筋コンクリート造と木造の混合構造となります。建物の角及び中間部分に鉄筋コンクリートのコアがあり、コアを繋ぐように木造が組立てられます。9月は全部で6個のコアがあるうちの4つのコアの鉄筋、型枠組立の後、1階層分のコンクリート打設を行っています。今後10月以降に、2階層までコンクリート打設を行います。コンクリート打設時にはミキサー車の往来が多くなります。引き続き、市道二条線上での交通誘導と徐行運転を徹底し、安全確保に努めていきます。皆様におかれましては、本工事へのご理解とご協力を賜り、大変感謝申し上げます。引き続きご不便、ご迷惑をお掛けしますが、安全第一に細心の注意を払って工事を進めてまいります。今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

2026.09.24 北東側より鳥瞰
1階壁配筋～壁型枠～コンクリート打設実施状況



西棟新築イメージ図
北東側より鳥瞰

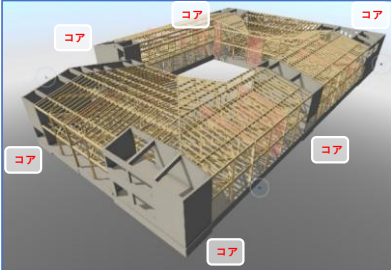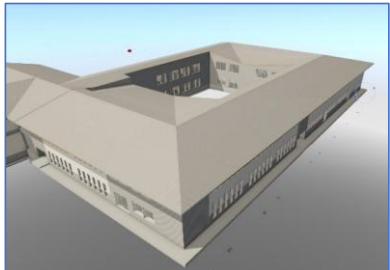

2026.09.10 2階床コンクリート打設後状況




2026.09.15 壁型枠施工状況



2026.09.30 屋根型枠施工状況



2026.09.01～2026.09.30 工事進捗 時系列 写真状況

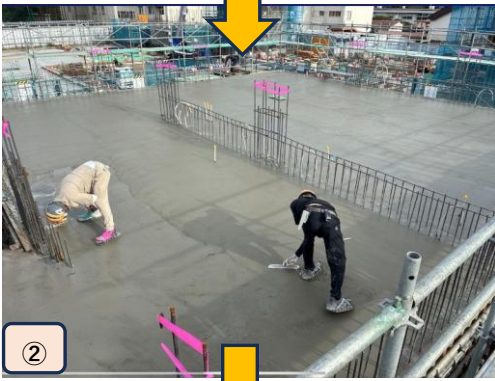

▲ ① 2階床部分の打設前、型枠鉄筋が出来上がった状態です。打設前に入念に検査を行い、図面通りの品質を確保します。
② コンクリート打設後には左官職人により床の左官抑えを行います。

▲ コア部分の躯体コンクリート打設状況です。
写真① コンクリート打設前には円陣を組み皆で士気を高めて打設に臨みます。
写真② 部屋の内部は型枠の側面から振動を与えて、コンクリートを密実にします。
写真③ 2階の床面からコンクリートを流し込みます。
写真④ 打設は生コン車2台により、ポンプ車にてコンクリート圧送をします。



▲ 生コン車は市道上に警備員2名体制で
▲ コンクリート打放面、仕上がり状況。

▼ 既存プールがあった西側の玉石積み撤去して、新しくブロック積を行っています。



◀ 9月は台風や秋雨前線の影響もあり長雨の日が続きました。現場は天候に配慮しながら、安全と品質を優先に進めました。
▶ 雨水貯留浸透槽「レインスタジアム」を建物北側へ設置しています。

