

# 中佐都バイパス 工事進捗状況 (6)

(中部横断自動車道 佐久中佐都インターチェンジ アクセス道路整備)

一般県道 塩名田佐久線 佐久市 中佐都地区 (社会資本整備総合交付金事業)


【事業概要】 ○全体計画延長 L=2,143m ○道路幅員 6.5 (12.0) m ○事業期間 平成22年度～

平成22年度から整備を進めております 一般県道塩名田佐久線 佐久市 中佐都バイパス (延長約2.1km) のうち、2期施工区間の、「落合北」交差点～「鳴瀬」交差点間1.1km 区間について、令和2年度中の開通を目指し、現在鋭意工事を進めています。R1年度発注の全7工区をもって完成の予定です。

・R1年度発注済工事

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1工区…浅科側水路工事     | 施工中 R2年4月末完成予定 |
| 2工区…IC側水路工事     | 施工中 R2年4月末完成予定 |
| 3工区…浅科側道路築造工事   | 1、2工区終了後着工予定   |
| 4工区…IC側道路築造工事   | 1、2工区終了後着工予定   |
| 5、6工区…舗装工事      | 3、4工区終了後着工予定   |
| 7工区…標識、区画線等設置工事 | 3、4工区終了後着工予定   |

付近の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

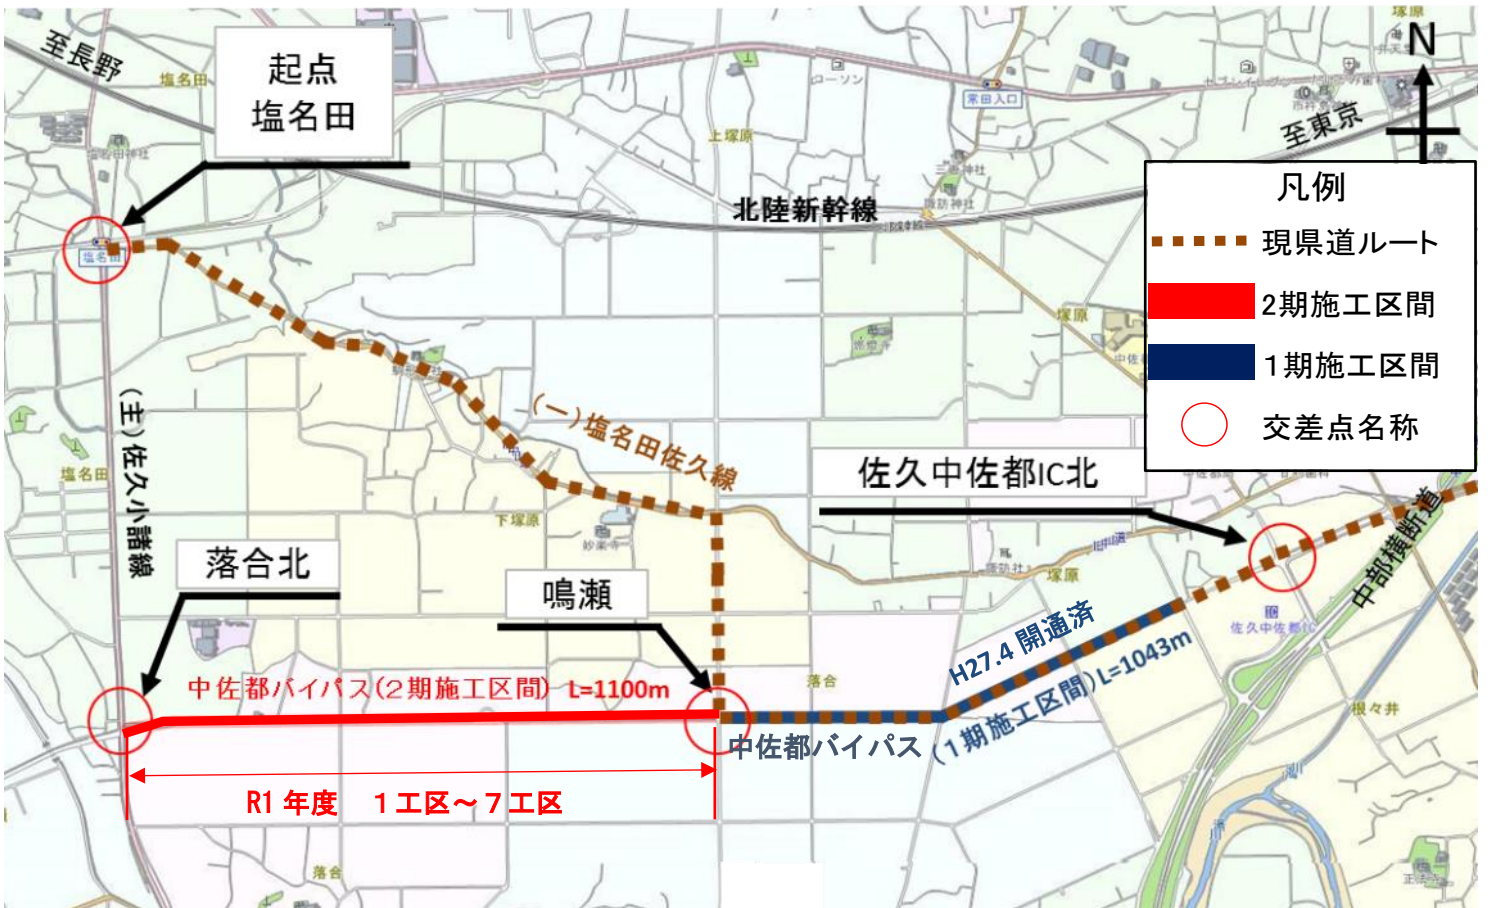

落合北交差点側より  
R2年3月13日撮影

至佐久中佐都IC

至浅科

落合北交差点



鳴瀬交差点側より  
R2年3月13日撮影



↑  
至浅科

↓  
至佐久中佐都IC

鳴瀬交差点

# 浅蓼大橋工区 工事進捗状況(2)

( (国)141号 4車線化工事 )


一般国道 141号 佐久市～小諸市 跡部～平原 (社会資本整備総合交付金事業)

【浅蓼大橋工区】○計画延長 L=840(うち橋梁 408)m ○道路幅員 13.0 (25.0) m ○事業期間 平成 26 年度～

平成 26 年度から事業を進めております 一般国道 141号 佐久市～小諸市 跡部～平原のうち、浅蓼大橋の 4 車線化工事を現在鋭意施工中です。



- ・H30 工事……A2 橋台の嵩上げ工を実施。(R2 年 2 月完成)
- ・R1 工事……第 1 橋 P2 (R2 年 2 月完成)  
P4 (R2 年 3 月完成)  
P6 (現在施工中)  
P3、P5(P6 工事終了後着工予定)

資材搬入出時には、国道が片側交互通行となるため、通行される皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

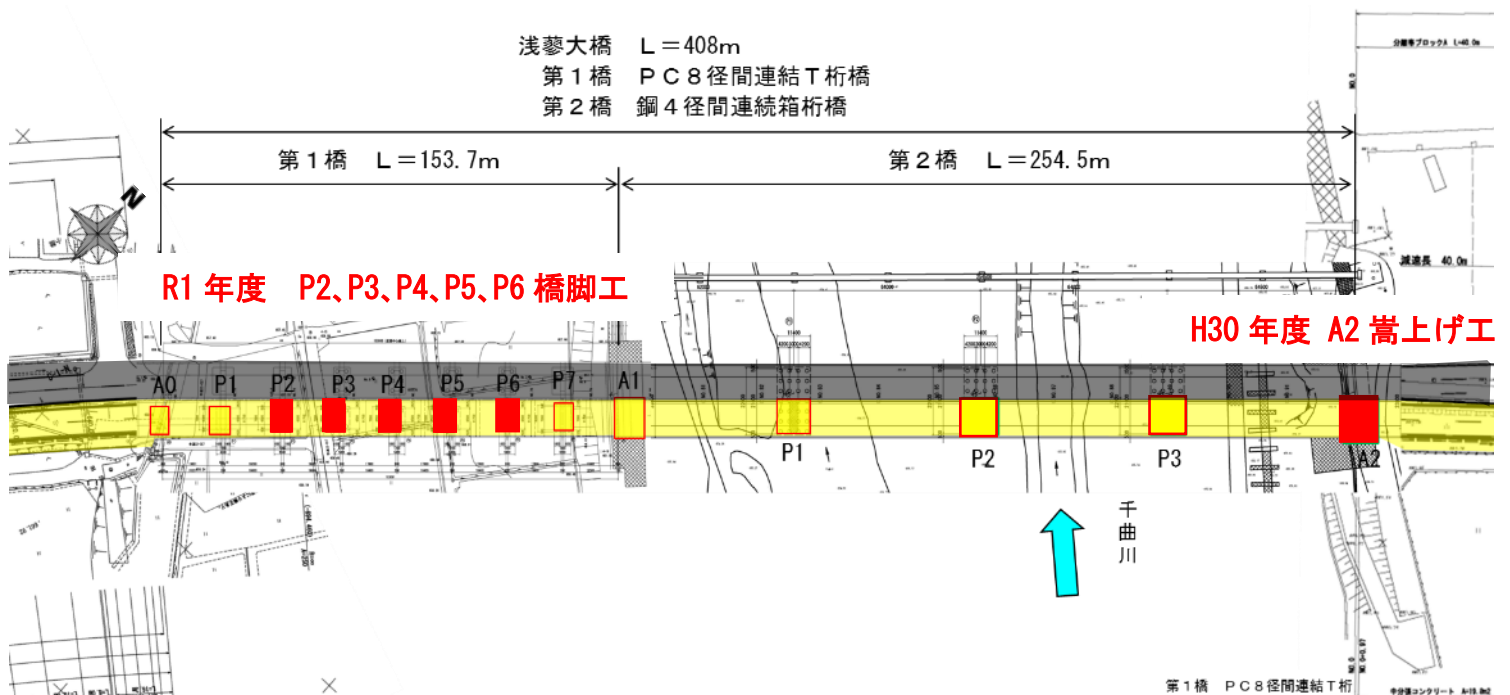

## 凡例

- 供用済み
- H30, R1 施工箇所
- R2 以降施工箇所
- 下部工箇所

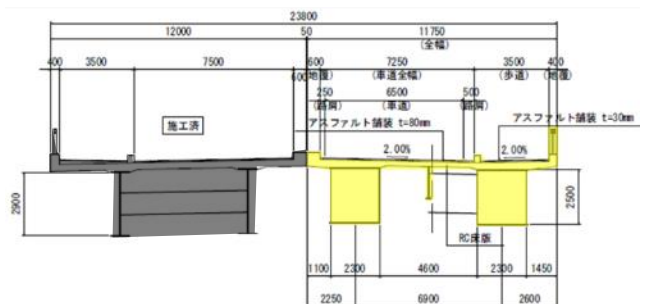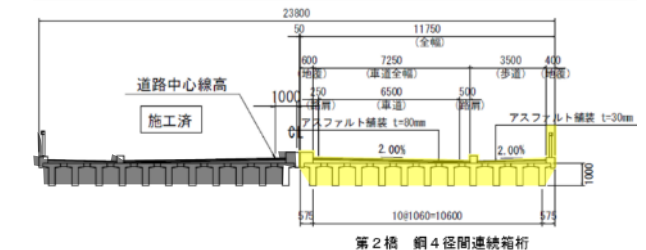



第1橋

第2橋

全葦崎

千曲川

全葦崎

P 6

(P5)

P 4

(P3)

P 2

浅夢大橋  
R2年3月13日撮影



浅夢大橋  
R2年3月13日撮影
