

(主)長野菅平線 落合橋北 道路築造工事



- 工事概要： 令和2年度 防災・安全交付金(道路)(緊急対策事業)工事 (主)長野菅平線 長野市 落合橋北1工区
- 工期： 令和3年3月～
- 発注者： 長野県長野建設事務所 TEL 026-234-9594(代表:026-233-5151)
- 受注者： 株式会社 喜久屋商会(9月現在)

【(主)長野菅平線 長野市 落合橋北 9月の工事について】

当現場では、9月現在、新しい道路を造るため、現状の土地の掘削工事を行っています。これは、計画通りの高さの道路を造るための工程です。この掘削工事を行うことで、新しい道路の線形が見えてきました！

そして次工程として、路床改良工事を行っています。これは、軟弱な現地盤において固い地盤とするための工程で、石灰系の改良材を路床(舗装の一番下の現地盤)に混合しています。丈夫な舗装を造るための下地構築作業であります。

【工事区間の状況(9月)】

早期開通に向けてがんばります！



起点より



中間点1




中間点2



終点より

【事業概要】

【工事の施工状況(9月)】

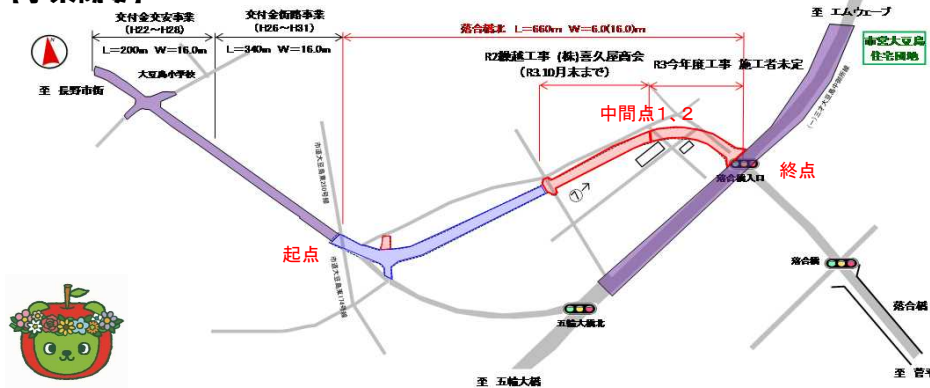

路床掘削状況(道路を所定の高さにするための掘削作業)



路床改良(石灰系)状況(軟弱な地盤を固めています)

