


被害状況

■ 令和元年東日本台風の豪雨による異常出水により、県管理区間の千曲川上流域では、堤防の破堤や護岸の損壊等により河川がはん濫し、家屋の倒壊や浸水、道路や農地の流出等の被害が発生した。

事業内容

■ 流下断面が不足している箇所「拡幅」を行う。（全体延長：1.95km 事業期間：令和元年度～令和7年度予定）

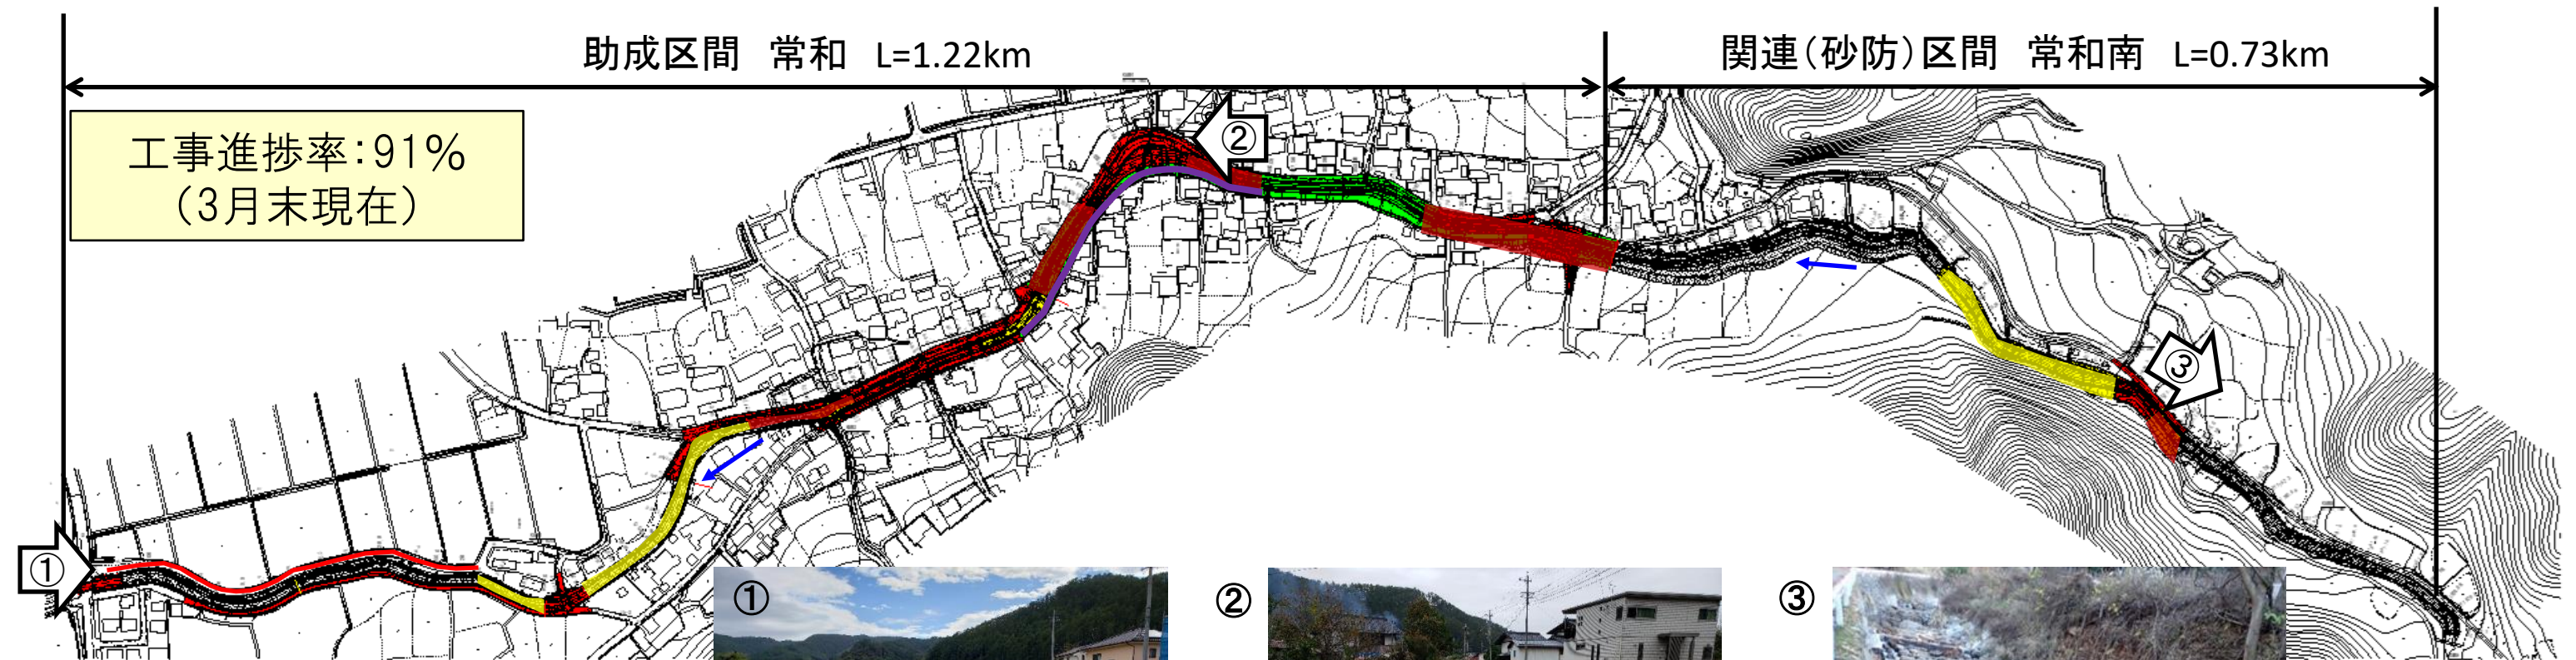

延長 L=1.95km
護岸工 L=3.5km
落差工 16基
帯工 19基
橋梁 7橋
取水工 4箇所

被災直後

進捗状況
(R7.3月末)

移転家屋 8棟
買収面積 4,591m²



凡 例

■ R元・R2工事
■ R3工事
■ R4～R6工事
■ R6～R7工事



災害復旧助成事業 千曲川上流工区 (一)谷川 佐久市 入沢(いりさわ)

- 被害状況
- 令和元年東日本台風の豪雨による異常出水により、県管理区間の千曲川上流域では、堤防の破堤や護岸の損壊等により河川がはん濫し、家屋の倒壊や浸水、道路や農地の流出等の被害が発生した。
- 事業内容
- 流下断面が不足している箇所「拡幅」を行う。(全体延長：1.52km 事業期間：令和元年度～令和6年度)


事業進捗率:100%
(令和6年8月完成)

延長 L=1.52km 護岸工 L=2.7km
落差工 10基 帯工 20基
橋梁 8橋 取水工 1箇所

平面図


災害助成事業 (一)谷川 入沢 L=1.52km

標準横断面図

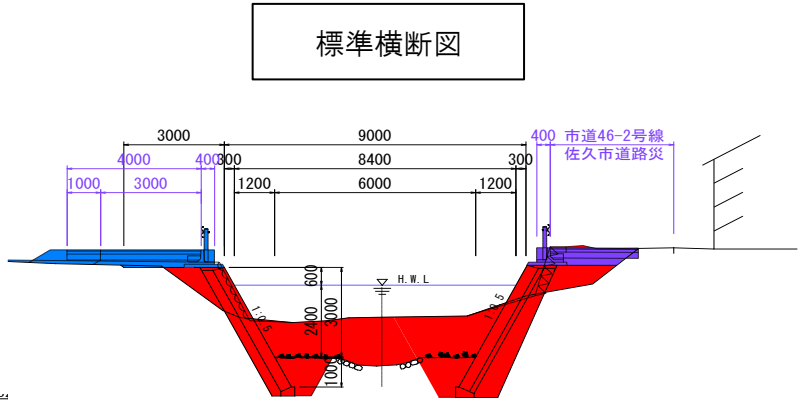

凡 例
 ■ R元・R2工事
 ■ R3工事
 ■ R4～R5工事

※市道復旧のみR6

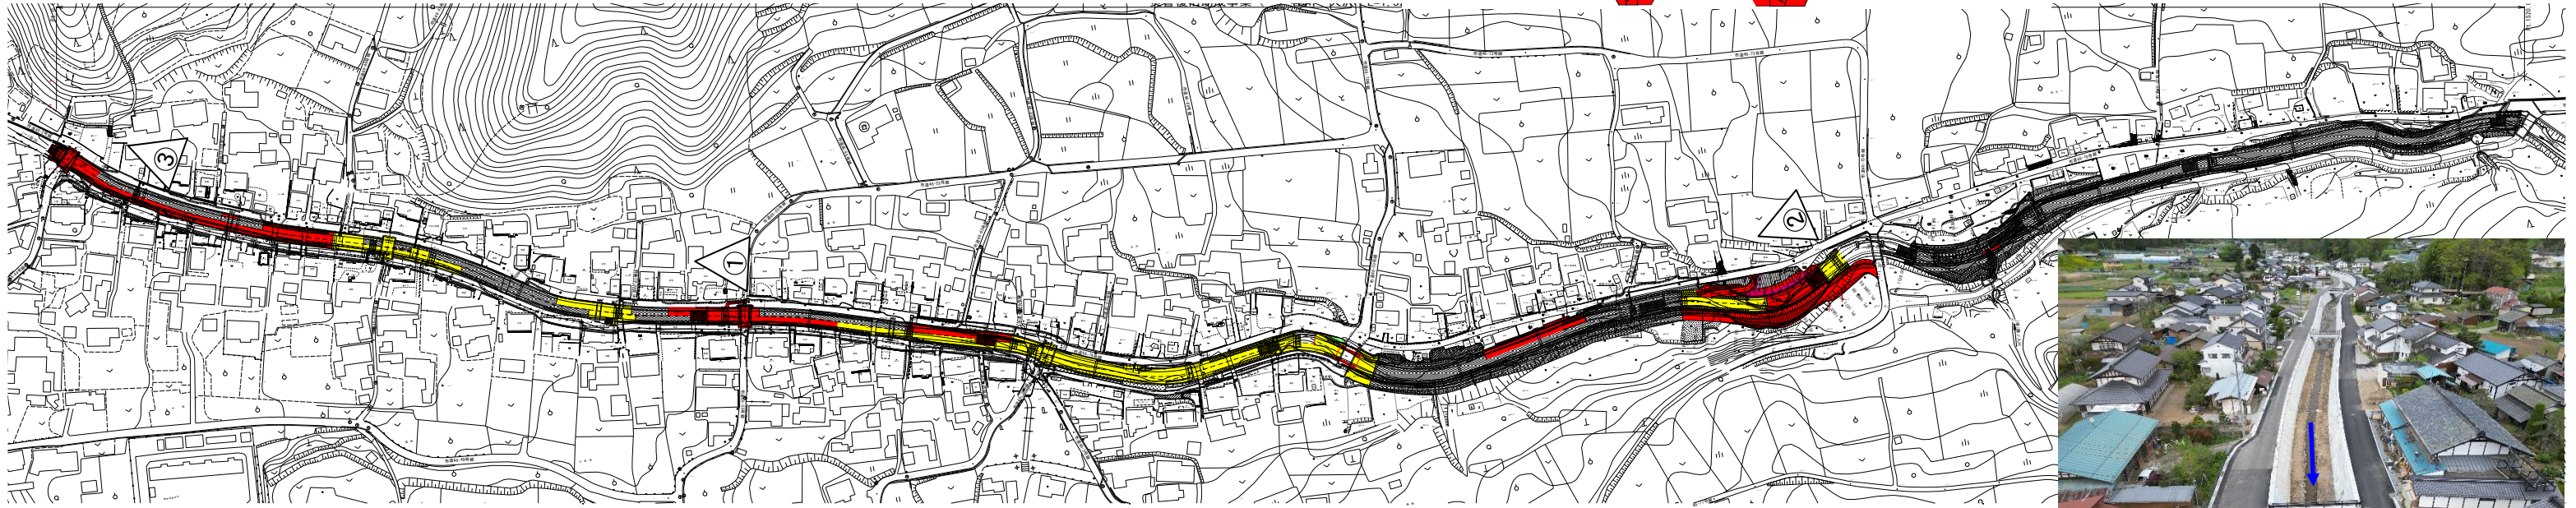

被災時



R6.8月末



被災時



R6.8月末

R6.8月末

災害復旧助成事業 千曲川上流工区 (一)滑津川 佐久市 石神(いしがみ)


被害状況

- 令和元年東日本台風の豪雨による異常出水により、県管理区間の千曲川上流域では、堤防の破堤や護岸の損壊等により河川がはん濫し、家屋の倒壊や浸水、道路や農地の流出等の被害が発生した。

事業内容

- 破堤箇所の改良復旧と既設堤防の「かさ上げ」による改修を行う。(全体延長：1.05km 事業期間：令和元年度～令和5年度)


事業進捗率:100%
(令和6年3月完成)

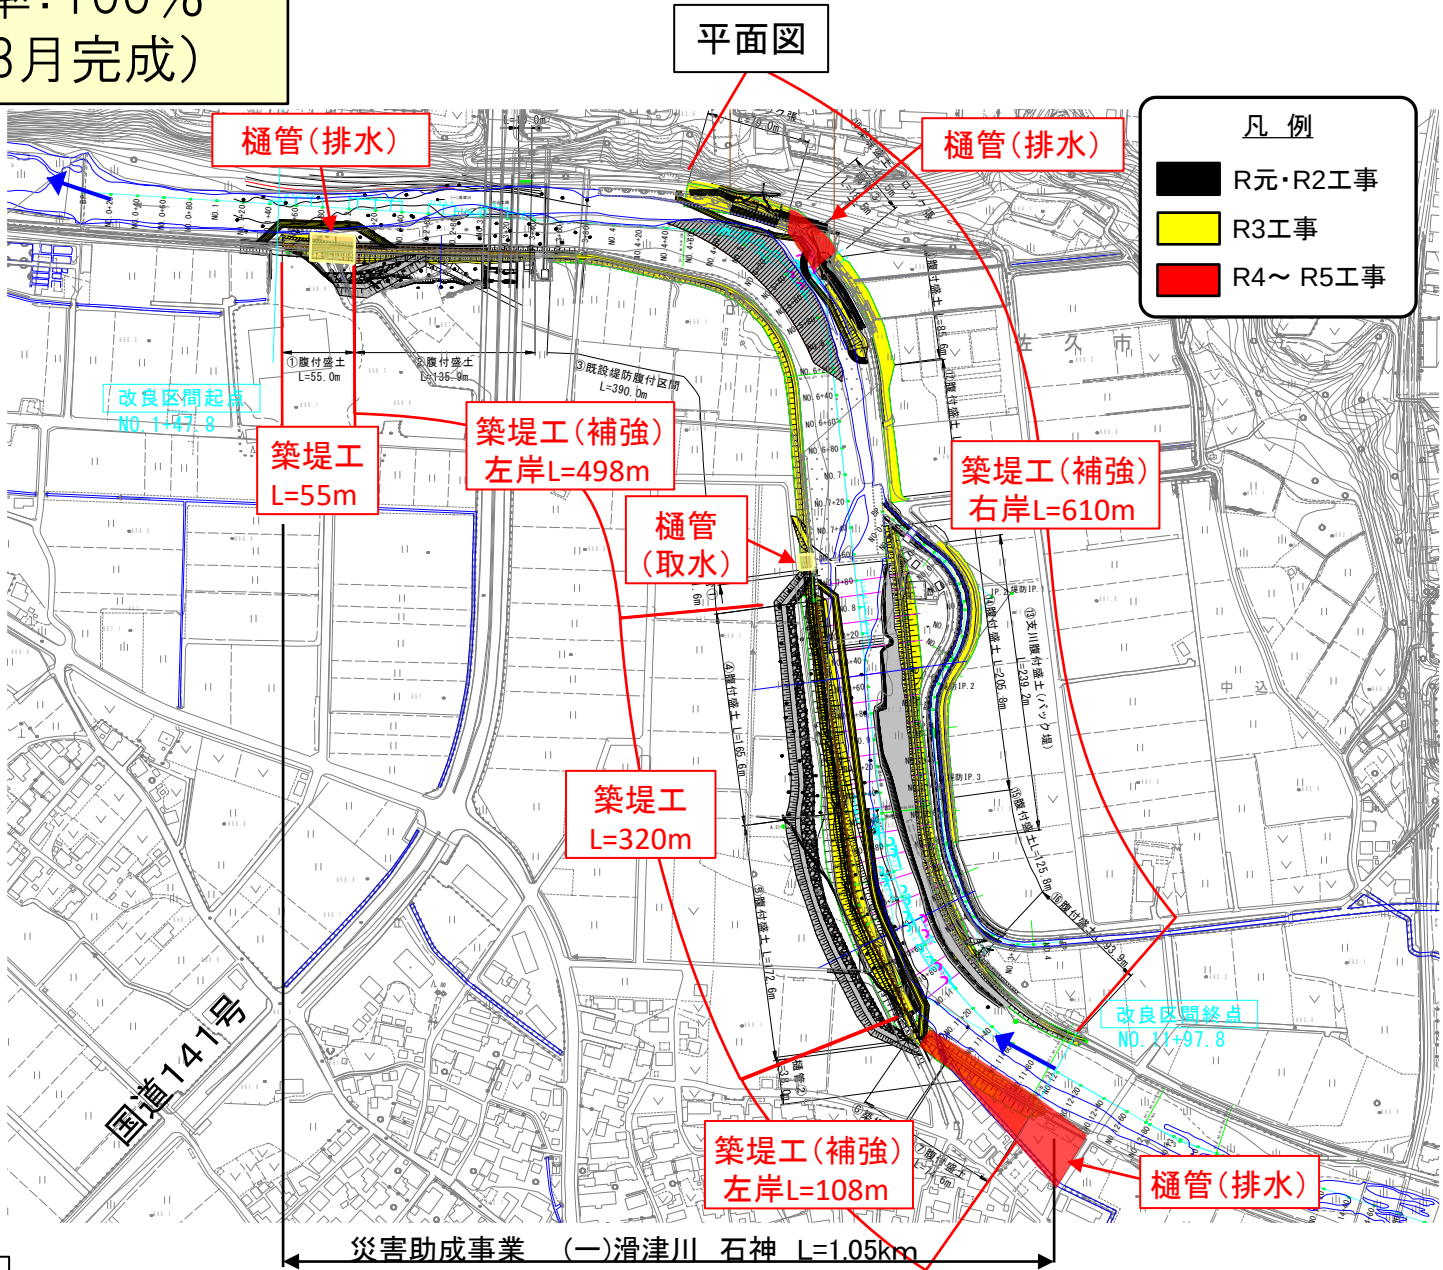

被災時



R6.3月末

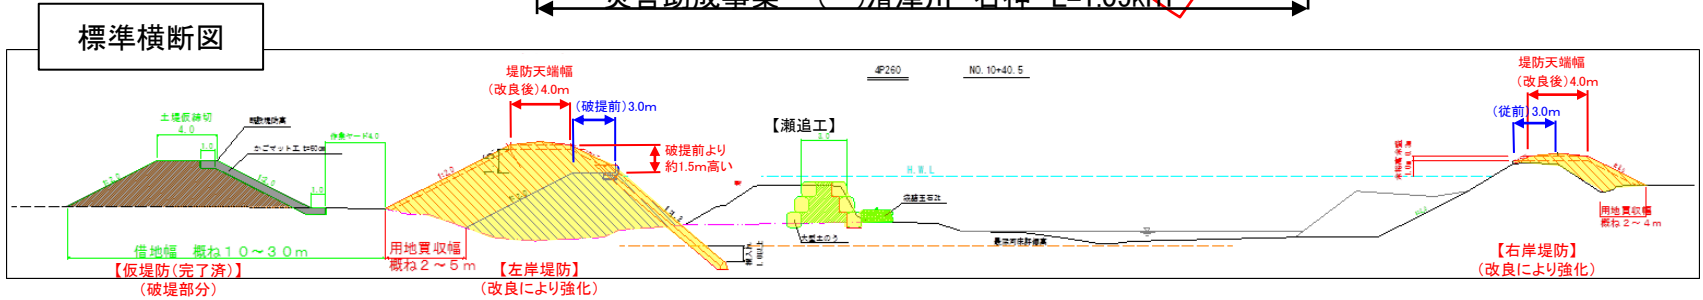

災害復旧助成事業 千曲川上流工区 佐久市 桜井遊水地(さくらい)


- 被害状況
- 令和元年東日本台風の豪雨による異常出水により、県管理区間の千曲川上流域では、堤防の破堤や護岸の損壊等により河川がはん濫し、家屋の倒壊や浸水、道路や農地の流出等の被害が発生した。
- 事業内容
- 滑津川合流地点付近の千曲川左岸側に断面拡幅による増量分を貯留するための「遊水地」を整備する。（事業期間：令和元年度～期間精査中）

航空写真

遊水地候補地




遊水地計画3次元立体モデル図

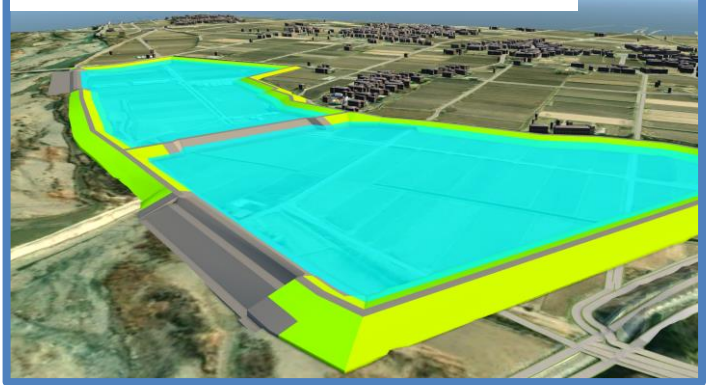

事業イメージ

概念図

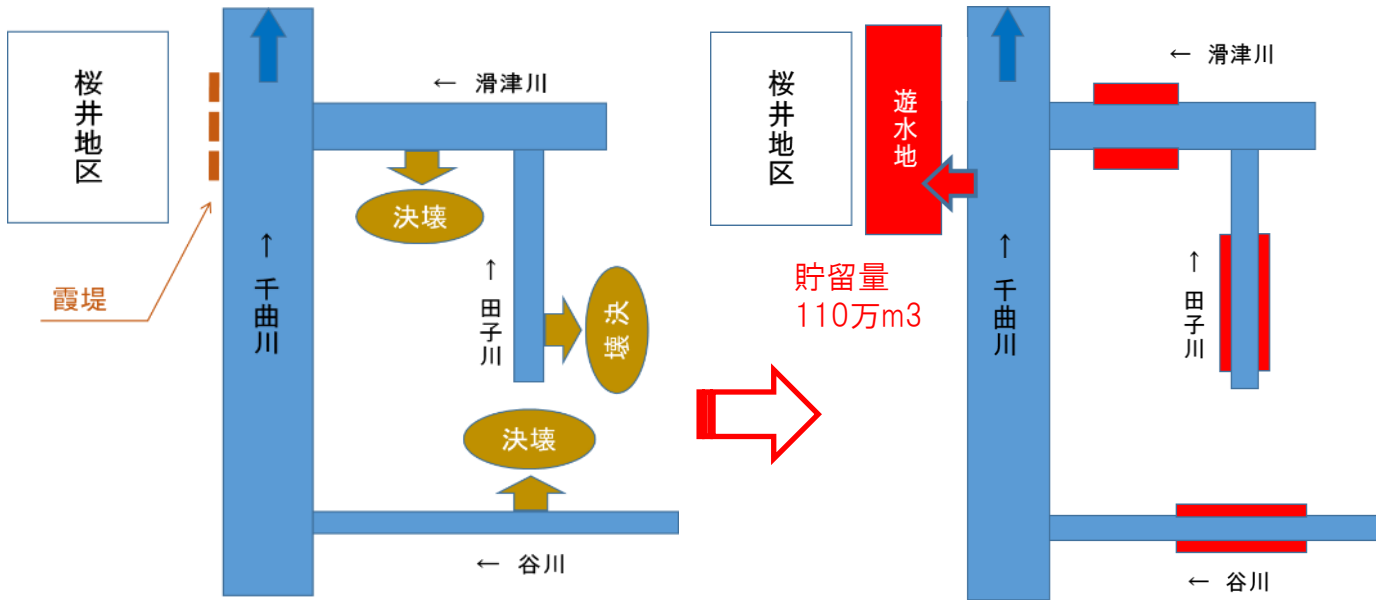

横断面図

