

令和2年度
地域発元気づくり支援金事業成果発表

矢ノ沢地籍ザゼン草の里
木道・遊歩道整備事業

発表者 有賀林野株式会社
令和2年度 代表取締役 小泉 吉彦

1

〈はじめに〉

【有賀林野株式会社】 諏訪市豊田有賀3223-2

平成28年 旧有賀林野利用農業協同組合

有賀林野株式会社

〔株主：255名 山林面積：460h〕

2

《矢ノ沢地籍ザゼン草公園の所在地》
県道 諏訪⇔辰野線頂上付近湿原



3

《ザゼン草とは？》



4

＜元気づくり支援金申請事業内容＞


事業タイプ : ソフト・ハード事業

総事業 : 4,210,800円

元気づくり支援金 : 2,877,000円

5

＜事業背景＞

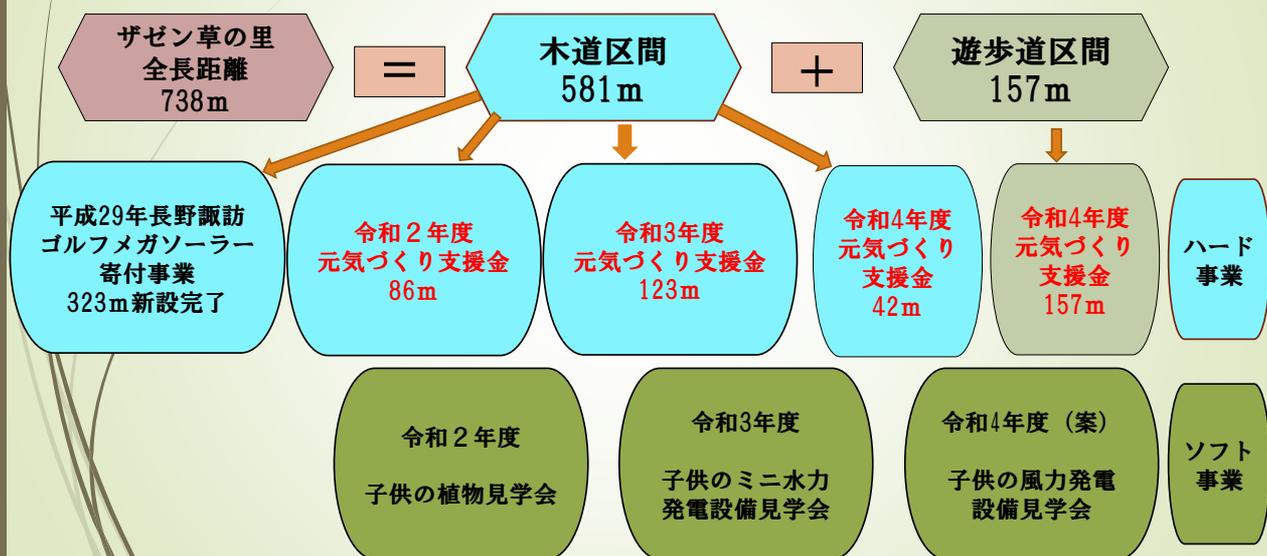

6

＜事業運営のコンセプト＞

地域住民の共同参画事業として取り組む「村おこし」

地域の子供たちに自然に興味を持ってもらう活動

ザゼン草公園へより多くの来園者が訪れる魅力発信

7

＜整備完了区間＞

平成29年長野諏訪ゴルフメガソーラー発電所
寄付事業 323m木道更新完了（全体2/5）



8

≪未整備区間 (3/5)≫



9

≪令和2年度ハード事業≫

地域住民参加 旧木道撤去作業 株主：208名参加

ポイント：コロナ対策で密を避け、一定間隔を取り4班に分けマスク着用で実施



10

《ハード事業木道整備》
令和2年度 86m工事風景



11

《ハード事業木道整備》
業者にて 新木道整備 86m 補助事業看板設置



12

《令和2年度ソフト事業》

豊田小学校3年生自然観察会 生徒40名・教師4名



13

《植物図鑑の作成と配布》

矢ノ沢ザゼン草公園内の植物図鑑（パンフレット作製）



14

《苦勞した点》

全ての活動に新型コロナ対策を講じた 密を避ける



バスの乗車は定員の半分

15

《事業の成果 I》

ザゼン草の里

木道 (581m) 323m+86m 令和2年度末409完成

172m 未実施区間

★令和3年度未整備 130m木道整備予定

★令和4年度未整備 42m木道整備予定

遊歩道 (157m) 未実施

★令和4年度未整備 157m遊歩道整備予定

16

＜事業の成果 II＞

ザゼン草公園祭りの来場者増 1,200名
+200名

共同作業で住民が地元の自然を再認識する
機会となった

小学生の自然観察会は多くの希少植物が観察できた

17

＜支援金対象外事業 - I＞

地域住民によるザゼン草公園内の草刈り作業



18

＜支援金対象外事業 一Ⅱ＞

豊田小学校5年生 自然エネルギー見学会（記念品付き）



19

＜今後の取り組み＞

「老若男女が安全に公園内の散策できる環境整備」

- ①令和 3年度新木道整備 130m **11/30時点工事完了**
- ②令和 4年度遊歩道整備 157m 予定
- 木道整備 42m 予定

令和 2年度～4年度までの3年間で、**未整備区間を整備完了**

「自然エネルギーを学べる環境整備」

- ①一級河川上野川を活用した『ミニ水力発電』令和3年設置
- ②『風力発電』令和4年度検討
- 現存ソーラー発電を含め、自然エネルギーを皆で学ぼう ♡
- ③ザゼン草公園パンフレットの更新

20

＜最後に＞

元気づくり支援金を通じて

地域の森の保全と山野草の保護

多くの市民と観光客が訪れる景勝地

魅力を高める活動を住民が共同して

森いっぱい運動に取り組む啓蒙ができた

21

ご清聴ありがとうございました

令和2年度の事業完結に当たりましては
「県の関係者の皆様」に大変お世話になり
本当に有難うございました



22
