

(様式-1)

低入札価格調査制度に関する調査回答について

令和 7 年 9 月 26 日

株式会社ヤマウラ

代表取締役社長 山浦 正貴

下記の工事の入札に関し、長野県が定める「低入札価格調査制度事務処理要領」に従い、資料を提出します。

なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また後日その事実が生じた場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。

記

1 工事名 令和6年度 国補ダムメンテナンス（加速化）工事

2 路河川名 横川川

3 箇所名 (一) 横川川 上伊那郡辰野町 横川ダム

4 工事概要 低水放流設備 機側操作盤 4 面、付属装置 一式

5 調査提出資料

- (1) 県が定める調査項目（1～10）に対する回答
- (2) 入札価格を算出した根拠となる工事費内訳書（別紙様式）
- (3) 下請け予定業者からの見積書等
- (4) そのほかの添付書類名

6 その他の調査回答事項

7 担当の所属氏名、連絡先

エンジニアリング事業部 営業部

電話番号 0265-83-8888

ファックス番号 0265-82-2879

(様式 1 の続き)

8 低入札価格調査項目に対する回答

	調査項目	回答
①	その価格により入札した理由 / (より具体的に記載する)	別紙御参照願います
②	入札価格の内訳書、見積書等の内容 / ・ 下請け業者の見積書 ・ 見積単価の根拠 ・ 施工体制台帳及び施工体系図 ・ 安全監理の方法と費用の見積書 など	別紙御参照願います
③	手持ち公共工事の状況 / ・ 手持ち公共工事の一覧 (発注機関を問わず) ・ 手持ち工事に配置されている技術者氏名	別紙御参照願います
④	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との 関連 (地理的条件) /	別紙御参照願います
⑤	手持ち資材の状況及び手持ち機械の状況 /	別紙御参照願います
⑥	資材購入先および購入先と入札者との関連 /	別紙御参照願います
⑦	建設副産物の処理方法と処理先 /	別紙御参照願います
⑧	技術者及び労働者の保有と配置計画 / ・ 社員数と当該現場への配置計画 (職種別) ・ 技術者リストと当該現場への配置予定者	別紙御参照願います
⑨	過去に施工した公共工事名及び発注者 / ・ 当該年度を含む過去 3 年間の受注実績 (年度毎の受注件数と請負金額、工事リスト) ・ 過去に低入札価格調査の対象となった工事名 とその施工体制台帳の写し	別紙御参照願います
⑩	経営内容 / (1) 建設業法施行規則第 4 条、第 10 条、第 19 条の 3 に該当する以下の様式。 ・ 様式 15 号 貸借対照表 ・ 様式 16 号 損益計算表 ・ 様式 17 号 株主資本等変動計算書 (2) 取引金融機関名 / 支店名まで記入	(1) 別紙御参照願います (2) 八十二銀行 駒ヶ根支店

以上の記載に相違ありません。

低入札価格調査書類

工 事 名：令和6年度 国補ダムメンテナンス（加速化）工事

工事箇所名：（一）横川川 上伊那郡辰野町 横川ダム

株式会社ヤマウラ

調査項目①

その価格により入札した理由

・株式会社ヤマウラには本工事の更新対象となる機側操作盤、自動制御盤（以下、機側操作盤等）を自社で設計・製作しております。

今後の同様の盤の設計・製作予定が見通せないため、工事量の確保を図りたいと考えております。本工事における機側操作盤等は類似の製作実績も多く、高い品質を確保しながらも設計・製作工数の合理化を図りやすいことから、積極的に受注すべき工事であると判断いたしました。

・機器単体費内の機側操作盤等については、板金、塗装、組立て、配線等工程別に協力業者から見積書を徴収し、また部品についてはご発注図面を参考に積算し、社内にて予算検討を行いました。その結果、応札した金額での設計・製作が可能であり、品質も充分確保できると判断いたしました。

・機器単体費の内、水位計等の機器類については購入品での対応を考えております。

水位計等については、特記仕様書記載の同等品機種の見積をメーカーから徴取し、設計価格にて購入できることを確認しました。

その他取り替え部品については、特記仕様書の規格を満足する部品を選定し、市場価格等をもとにその価格を採用しました。

機器・部品ともに特記仕様書の規格を満足する機器を選定しており、品質も充分確保できると判断しました。

・機器撤去据付工事費については、設計書に記載されている工数を参考にして算出しました。

工事発注予定業者から見積を徴取し、設計書に御提示された数量は、適正な工事を行うのに十分な工数であると考えます。

よって工事における品質も充分確保できると判断しました。

・共通仮設費、現場管理費、設計技術費につきましては、ダム用水門設備積算基準に沿った率を採用いたしました。

・一般管理費については営業戦略上、通常の経費率より低く見積った価格といたしました。

・結果、低入札となりましたが、入札した価格にて工事の品質及び安全面の確保を十分に行い、良質な施工が可能であると判断いたしました。

調査項目②

入札価格の内訳書、見積書等の内容

1. 工事費内訳書
2. 業者見積
3. 施工体制台帳および施工体系図
4. 安全監理の方法と費用の見積書

安全監理の方法に付き「作業標準書」をご提示いたします。

かかる費用は、共通仮設費、現場管理費にてまかいます。

工 事 費 内 訳 書

提 出 日 令和7年 9月 24日

発 注 者 長野県 伊那建設事務所長 殿

工 事 名 令和6年度 国補ダムメンテナンス（加速化）工事

工事箇所名 （一）横川川 上伊那郡辰野町 横川ダム

商号又は名称 株式会社 山浦建設

住所 長野県伊那市辰野町2-2番1号

代表者名 代表取締役社長 山浦 正貴

工事費内訳書

P1/10

	(工事費内訳書) ** 本工事費 **								
	費目・工種・種別・細別・施工名称など	規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	** 本工事費 **								
2	制作原価				1	式		54,700,000	工種 第0001号表
3	据付工事原価				1	式		25,717,343	工種 第0004号表
4	設計技術費				1	式	80,417,343	2,066,000	
5	** 直接費 **							82,483,343	
6	** 一般管理費 **				1	式	82,483,343	9,516,657	
7	** 価格計 **							92,000,000	
8	** 消費税等相当額計 **								
9	** 合計額 **								

工事費内訳書

P2/10

工 種 明 細 表		工種 第0001号表							
制作原価									
	工種・施工名称など	規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接製作費				1	式		54,700,000	工種 第0002号表
2	*** 単位当り ***				1	式		54,700,000	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

工事費内訳書

P3/10

工 種 明 細 表		工 種 第0002号表							
直接製作費									
	工 種 ・ 施 工 名 称 など	規 格 1	規 格 2	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	機器単体費				1	式		54,700,000	工 種 第0003号表
2	*** 単位当り ***				1	式		54,700,000	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

工事費内訳書

P4/10

工 種 明 細 表		工種 第0003号表							
機器単体費									
	工種・施工名称など	規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	機側操作盤（取水設備）				1	面	9,700,000	9,700,000	
2	取水設備自動制御盤				1	面	10,500,000	10,500,000	
3	取水設備水位計				2	台	850,000	1,700,000	
4	機側操作盤（常用放流設備）				1	面	11,000,000	11,000,000	
5	機側操作盤（非常用放流設備）				1	面	10,800,000	10,800,000	
6	機側操作盤（水位調整ゲート）				1	面	11,000,000	11,000,000	
7	*** 単位当り ***				1	式		54,700,000	
8									
9									

株式会社ヤマウラ

工事費内訳書

P5/10

工 種 明 細 表		工種 第0004号表							
据付工事原価									
	工種・施工名称など	規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接工事費				1	式		10,734,343	工種 第0005号表
2	間接工事費				1	式		14,983,000	工種 第0009号表
3	*** 単位当り ***				1	式		25,717,343	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

工事費内訳書

P6/10

工 種 明 細 表		工 種 第0005号表							
直接工事費									
	工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	規 格 1	規 格 2	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	輸送費				1	式		126,000	工種 第0006号表
2	労務費				1	式		8,346,583	工種 第0007号表
3	直接経費				1	式		2,261,760	工種 第0008号表
4	*** 単位当り ***				1	式		10,734,343	
5									
6									
7									
8									
9									

株式会社ヤマウラ

工事費内訳書

P7/10

工種明細表		工種 第0006号表							
輸送費									
	工種・施工名称など	規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	輸送費	重量=2.23t	距離=103km		1	式		126,000	
2	*** 単位当り ***				1	式		126,000	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

工事費内訳書

P8/10

工 種 明 細 表		工 種 第0007号表							
労務費									
	工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	規 格 1	規 格 2	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	機械設備据付工				87	人	31,512	2,741,544	
2	機械設備据付工				52	人	31,512	1,638,624	
3	機械設備据付工				52	人	31,512	1,638,624	
4	機械設備据付工				52	人	31,512	1,638,624	
5	据付材料費			2.50%	1	式	7,657,416	191,435	
6	据付補助材料費			6.50%	1	式	7,657,416	497,732	
7	*** 単位当り ***				1	式		8,346,583	
8									
9									

株式会社ヤマウラ

工事費内訳書

P9/10

工 種 明 細 表		工 種 第0008号表							
直接経費									
	工 種 ・ 施 工 名 称 など	規 格 1	規 格 2	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	トラック運転 (機-18)	クレーン装置付 4～ 4.5t積2.9t吊			44	日	45,040	1,981,760	
2	産廃廃棄物処理費				1	式		280,000	
3	*** 単位当り ***				1	式		2,261,760	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

工事費内訳書

P10/10

工 種 明 細 表		工種 第0009号表							
間接工事費									
	工種・施工名称など	規格1	規格2	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	共通仮設費				1	式	10,734,343	1,717,000	
2	現場管理費				1	式	12,451,343	2,546,000	
3	据付間接費				1	式	7,657,416	10,720,000	
4	*** 単位当り ***				1	式		14,983,000	
5									
6									
7									
8									
9									

機器単体費

消費税 10%込み

件名 【横川ダム】令和6年度 国補 ダムメンテナンス（加速化）工事
納入先 長野県

項目1（装置名等）	項目2（作業・ユニット等）	項目3（部材等）	単価	数量	小計（税抜）	合計（税込）
★取水設備（取水ゲート機側操作盤／自動制御盤／水位計）						
取水設備機側操作盤						
W600×D750×H1950	板金	本体	700,000	1.0	700,000	
扉3.2t		塗装	160,000	1.0	160,000	
屋外（前背面扉）						
5Y7/1半ツヤ	部材	購入部材	3,300,000	1.0	3,300,000	
PLC＋リレー方式						
UPS有	組配		750,000	1.0	750,000	
						5,401,000
	設計・検査	設計（システム）	36,000	3.0	108,000	
		設計（機構）	36,000	10.0	360,000	
		設計（電気）	36,000	20.0	720,000	
		設計（ソフトウェア）	36,000	30.0	1,080,000	
		検査	36,000	15.0	540,000	
						2,808,000
自動制御盤						
W800×D750×H1900	板金	本体	650,000	1.0	650,000	
扉3.2t		塗装	170,000	1.0	170,000	
屋外（前背面扉）					0	
5Y7/1半ツヤ	部材	購入部材	2,800,000	1.0	2,800,000	
PLC方式						
UPSは取水機側より	組配		700,000	1.0	700,000	
						4,752,000
	設計・検査	設計（システム）	36,000	10.0	360,000	
		設計（機構）	36,000	10.0	360,000	
		設計（電気）	36,000	25.0	900,000	
		設計（ソフトウェア）	36,000	65.0	2,340,000	
		検査	36,000	20.0	720,000	
						4,680,000
取水設備水位計						
水位計	投げ込み式圧力水位計	水位計	550,000	2.0	1,100,000	
		避雷器	50,000	2.0	100,000	
						1,320,000
	設計・検査	設計・管理	36,000	2.0	72,000	
		検査	36,000	2.0	72,000	
						144,000
★放流設備（常用放流設備機側盤／非常用放流設備機側盤／水位調整ゲート機側盤）						
常用放流設備操作盤						
W800×D500×H2100	板金	本体	720,000	1.0	720,000	
扉3.2t		塗装	170,000	1.0	170,000	
屋外（前背面扉）						
5Y7/1半ツヤ	部材	購入部材	3,300,000	1.0	3,300,000	
PLC＋リレー方式	組配		800,000	1.0	800,000	
UPS有						5,489,000
	設計・検査	設計（システム）	36,000	3.0	108,000	
		設計（機構）	36,000	10.0	360,000	
		設計（電気）	36,000	22.0	792,000	
		設計（ソフトウェア）	36,000	30.0	1,080,000	
		検査	36,000	15.0	540,000	
						2,880,000
非常用放流設備操作盤						
W600×D500×H2100	板金	本体	650,000	1.0	650,000	
扉3.2t		塗装	150,000	1.0	150,000	
屋外（前背面扉）						
5Y7/1半ツヤ	部材	購入部材	3,300,000	1.0	3,300,000	
PLC＋リレー方式	組配		800,000	1.0	800,000	
UPS有						5,390,000
	設計・検査	設計（システム）	36,000	3.0	108,000	
		設計（機構）	36,000	10.0	360,000	
		設計（電気）	36,000	20.0	720,000	
		設計（ソフトウェア）	36,000	30.0	1,080,000	
		検査	36,000	15.0	540,000	
						2,808,000
水位調整ゲート						
W800×D750×H2100	板金	本体	730,000	1.0	730,000	
扉3.2t		塗装	180,000	1.0	180,000	
屋外（前背面扉）						
5Y7/1半ツヤ	部材	購入部材	3,000,000	1.0	3,000,000	
PLC＋リレー方式	組配		800,000	1.0	800,000	
UPS有						5,181,000
	設計・検査	設計（システム）	36,000	3.0	108,000	
		設計（機構）	36,000	10.0	360,000	
		設計（電気）	36,000	20.0	720,000	
		設計（ソフトウェア）	36,000	30.0	1,080,000	
		検査	36,000	15.0	540,000	
						2,808,000
総合計						43,661,000

御 見 積 書

見積No. 2509-037

2025年9月12日

(株)ヤマウラ

様

株式会社 竜東スチール
代表 伊藤 正弘
長野県伊那市東春近
Tel 0265-78-0704
Fax 0265-78-9444
E-mail m.ito@ryutou.jp

承認	作成
25.09.12	25.09.12

下記の通り、御見積申し上げます。

本書見積有効期限 発行日より15日

【見積内訳】

	品名	数量	単価	金額	備考
1	【工事名】 横川ダム令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事	1	¥ 700,000	¥ 700,000	
2	【装置名】 取水設備機側操作盤				
3	【筐 体】 屋外仕様(前背面扉) W600×D750×H1950				
4	【材 質】 電気亜鉛めっき鋼板(扉3.2t)				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

見積金額 ¥ 700,000
消費税額 ¥ 70,000
税込見積金額 ¥ 770,000

【備考】

御 見 積 書

見積No. 2509-038

2025年9月12日

(株)ヤマウラ

様

株式会社 竜東スチール

代表 伊藤 正弘

長野県伊那市東春近

Tel 0265-78-0704

Fax 0265-78-9444

E-mail m.ito@ryutou.jp

承認	作成
25.09.12	25.09.12

下記の通り、御見積申し上げます。

本書見積有効期限

発行日より15日

【見積内訳】

	品名	数量	単価	金額	備考
1	【工事名】 横川ダム令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事	1	¥ 650,000	¥ 650,000	
2	【装置名】 自動制御盤				
3	【筐 体】 屋外仕様(前背面扉) W800×D750×H1900				
4	【材 質】 電気亜鉛めっき鋼板(扉3.2t)				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

見積金額 ¥ 650,000

消費税額 ¥ 65,000

税込見積金額 ¥ 715,000

【備考】

--

御 見 積 書

見積No. 2509-039

2025年9月12日

(株)ヤマウラ

様

株式会社 竜東スチール
代表 伊藤 正弘
長野県伊那市東春近
Tel 0265-78-0704
Fax 0265-78-9444
E-mail m.ito@ryutou.jp

承認	作成
25.09.12	25.09.12

下記の通り、御見積申し上げます。

本書見積有効期限 発行日より15日

【見積内訳】

	品名	数量	単価	金額	備考
1	【工事名】 横川ダム令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事	1	¥ 720,000	¥ 720,000	
2	【装置名】 常用放流設備操作盤				
3	【筐 体】 屋外仕様(前背面扉) W800×D500×H2100				
4	【材 質】 電気亜鉛めっき鋼板(扉3.2t)				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

見積金額 ¥ 720,000
消費税額 ¥ 72,000
税込見積金額 ¥ 792,000

【備考】

御 見 積 書

見積No. 2509-040

2025年9月12日

(株)ヤマウラ

様

株式会社 竜東スチール

代表 伊藤 正弘

長野県伊那市東春近

Tel 0265-78-0704

Fax 0265-78-9444

E-mail m.ito@ryutou.jp

承認	作成
25.09.12	25.09.12

下記の通り、御見積申し上げます。

本書見積有効期限

発行日より15日

【見積内訳】

	品名	数量	単価	金額	備考
1	【工事名】 横川ダム令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事	1	¥ 650,000	¥ 650,000	
2	【装置名】 非常用放流設備操作盤				
3	【筐 体】 屋外仕様(前背面扉) W600×D500×H2100				
4	【材 質】 電気亜鉛めっき鋼板(扉3.2t)				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

見積金額 ¥ 650,000

消費税額 ¥ 65,000

税込見積金額 ¥ 715,000

【備考】

御 見 積 書

見積No. 2509-041

2025年9月12日

(株)ヤマウラ

様

株式会社 竜東スチール

代表 伊藤 正弘

長野県伊那市東春近

Tel 0265-78-0704

Fax 0265-78-9444

E-mail m.ito@ryutou.jp

下記の通り、御見積申し上げます。

承認	作成
25.09.12	25.09.12

本書見積有効期限

発行日より15日

【見積内訳】

	品名	数量	単価	金額	備考
1	【工事名】 横川ダム令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事	1	¥ 730,000	¥ 730,000	
2	【装置名】 水位調整ゲート				
3	【筐 体】 屋外仕様(前背面扉) W800×D750×H2100				
4	【材 質】 電気亜鉛めっき鋼板(扉3.2t)				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

見積金額 ¥ 730,000

消費税額 ¥ 73,000

税込見積金額 ¥ 803,000

【備考】

御見積書

(株)ヤマウラエンジニアリング 殿

9月 8日付御照会に対し下記の通り御見積申
上げましたから御下命の程お願い申し上げます。

発行日 令和7年 9月 12日

No.20250912-1

T396-0001

長野県伊那市福島22

大明精機(株) 伊那工

塗装事業部

TEL (0265) 98—5000

FAX (0265) 98-5100

担当者

納 期 別途打合せ

受 渡 場 所

荷 造 運 賃

見積有効期限	本書日付後 30日
--------	-----------

御 支 払 方 法

消費税

合計金額

【ワーク名】横川ダム令和6年度国補ダムメンテナンス(加速化)工事
塗装色:5Y7/1半艶

形式 ・ 品名 ・ 仕様	数量	単 価	金 額
取水設備機側操作盤			
筐体：屋外仕様（前背面扉）W800×D750×H1950	1式	160,000	160,000
消費税は含まれません			
貴社御担当	様	合計金額	160,000

御見積書

(株)ヤマウラエンジニアリング 殿

9月 8日付御照会に対し下記の通り御見積申
上げましたから御下命の程お願い申し上げます。

発行日 令和7年 9月 12日

No.20250912-2

T396-0001

長野県伊那市福島2

大明精機(株) 伊那

塗装事業部

TEL (0265) 98-5000

FAX (0265) 98-5100

担当者

納 期 別途打合せ

受 渡 場 所

荷 造 運 賃

見 積 有 効 期 限	本書日付後	30日
-------------	-------	-----

御 支 払 方 法

消費税

合計金額

【ワーク名】横川ダム令和6年度国補ダムメンテナンス(加速化)工事

塗裝色:5Y7/1半艶

形式 ・ 品名 ・ 仕様	数量	単 価	金 額
自動制御盤			
筐体：屋外仕様（前背面扉）W800×D750×H1900	1式	170,000	170,000
消費税は含まれません			
貴社御担当	様	合計金額	170,000

御見積書

(株)ヤマウラエンジニアリング 殿

9月 8日付御照会に対し下記の通り御見積申
上げましたから御下命の程お願い申し上げます。

発行日 令和7年 9月 12日

No.20250912-3

T396-0001

長野県伊那市福島22

大明精機(株) 伊那工

塗装事業部

TEL (0265) 98-5000

FAX (0265) 98-5100

担当者

納 期 別途打合せ

受 渡 場 所

荷 造 運 賃

見 積 有 効 期 限 本書日付後 30日

御 支 払 方 法

消費税

合計金額

【ワーク名】横川ダム令和6年度国補ダムメンテナンス(加速化)工事

塗裝色:5Y7/1半艷

[illegible]

御見積書

(株)ヤマウラエンジニアリング 殿

9月 8日付御照会に対し下記の通り御見積申
上げましたから御下命の程お願い申し上げます。

発行日 令和7年 9月 12日

No.20250912-4

T396-0001

長野県伊那市福島228

大明精機(株) 伊那工

塗装事業部

TEL (0265) 98—5000

FAX (0265) 98—5100

担当者

納 期 別途打合せ

受 渡 場 所

荷 造 運 賃

見積有効期限	本書日付後 30日
--------	-----------

御 支 払 方 法

消費税

合計金額

【ワーク名】横川ダム令和6年度国補ダムメンテナンス(加速化)工事

塗裝色:5Y7/1半艶

形式 ・ 品名 ・ 仕様	数量	単価	金額
非常用放流設備操作盤			
筐体：屋外仕様（前背面扉）W600×D500×H2100	1式	150,000	150,000
消費税は含まれません			
貴社御担当	様	合計金額	150,000

御見積書

(株)ヤマウラエンジニアリング 殿

9月 8日付御照会に対し下記の通り御見積申
上げましたから御下命の程お願い申し上げます。

発行日 令和7年 9月 12日

No.20250912-5

〒396-0001

長野県伊那市福島228

大明精機(株) 伊那工

塗装事業部

TEL (0265) 98-5000

FAX (0265) 98-5100

担当者



納	期	別途打合せ
受	渡	場 所
荷	造	運 賃
見	積	有 効 期 限
御	支	払 方 法

消 費 税

合 計 金 額

【ワーク名】横川ダム令和6年度国補ダムメンテナンス(加速化)工事
塗装色:5Y7/1半艶

形式 ・ 品名 ・ 仕様	数量	単 価	金 額
水位調整ゲート			
筐体: 屋外仕様 (前背面扉) W800×D750×H2100	1式	180,000	180,000
消費税は含まれません			
貴社御担当	様	合計金額	180,000

御見積書

No. YAM-1608

株式会社ヤマウラ 御中

御照会に対し下記の通り御見積申し上げます。

件名: 横川ダム 取水設備機側操作盤

納期: 打合せによる

支払条件: 従来通り

見積有効期限: 発行後、3ヶ月

見積金額: ￥ 750,000 也

*但し、支給品は除きます。

2025年9月1日

株式会社 つばくろ電機

本社

長野県北安曇郡松川村5794-296

TEL 0261-62-2751

FAX 0261-62-3100

南神戸工場

長野県北安曇

TEL

FAX

	品 名	数 量	単 価	合 計
1	組配費	1	￥ 750,000	￥ 750,000
	総合計金額			￥ 750,000

図番: 【横川ダム】 令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化) 工事

備考: 本見積書に、消費税は含まれません。

御見積書

No. YAM-1609

株式会社ヤマウラ 御中

御照会に対し下記の通り御見積申し上げます。

件名. 横川ダム 自動制御盤

納期. 打合せによる

支払条件. 従来通り

見積有効期限. 発行後、3ヶ月

見積金額. ￥ 700,000 也

2025年9月1日

株式会社 つばくろ電機
本社

長野県北安曇郡松川村5794-296

TEL 0261-62-2751

FAX 0261-62-3100

南神戸工場

長野県北安曇 21

TEL 0

FAX 1

*但し、支給品は除きます。

	品 名	数量	単 価	合 計
1	組配費	1	￥ 700,000	￥ 700,000
	総合計金額			￥ 700,000

図番. 【横川ダム】 令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化) 工事

備考. 本見積書に、消費税は含まれません。

御見積書

No. YAM-1610

株式会社ヤマウラ 御中
御照会に対し下記の通り御見積申し上げます。

件名. 横川ダム 常用放流設備操作盤

納期. 打合せによる

支払条件. 従来通り

見積有効期限. 発行後、3ヶ月

見積金額. ￥ 800,000 也

*但し、支給品は除きます。

2025年9月1日
株式会社 つばくろ電機
本社
長野県北安曇郡松川村5794-296
TEL 0261-62-2751
FAX 0261-62-3100
南神戸工場
長野県北安曇 21
TEL 0
FAX 1

	品 名	数量	単 価	合 計
1	組配費	1	￥ 800,000	￥ 800,000
	総合計金額			￥ 800,000

図番. 【横川ダム】 令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化) 工事
備考. 本見積書に、消費税は含まれません。

御見積書

No. **YAM-1611**

株式会社ヤマウラ 御中

御照会に対し下記の通り御見積申し上げます。

件名. 横川ダム 非常用放流設備操作盤

納期. 打合せによる

支払条件. 従来通り

見積有効期限、発行後、3ヶ月

見積金額. ¥ 800,000 也

2025年9月1日

株式会社 つばくろ電機

本社

長野県北安曇郡松川村5794-296

TEL 0261-62-2751

FAX 0261-62-3100

南神戸工場

長野県北安曇 21

TEL [REDACTED] 0

FAX [REDACTED] 1

*但し、支給品は除きます。

	品 名	数 量	単 価	合 計
1	組配費	1	¥ 800,000	¥ 800,000
	総合計金額			¥ 800,000

図番. **【横川ダム】** 令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化)工事

備考. 本見積書に、消費税は含まれません。

御見積書

No. YAM-1612

株式会社ヤマウラ 御中

御照会に対し下記の通り御見積申し上げます。

件名. 横川ダム 水位調整ゲート

納期. 打合せによる

支払条件. 従来通り

見積有効期限. 発行後、3ヶ月

見積金額. ￥ 800,000 也

*但し、支給品は除きます。

2025年9月1日

株式会社 つばくろ電機

本社

長野県北安曇郡松川村5794-296

TEL 0261-62-2751

FAX 0261-62-3100

南神戸工場

長野県北安曇

TEL

FAX

	品 名	数量	単 価	合 計
1	組配費	1	￥ 800,000	￥ 800,000
	総合計金額			￥ 800,000

図番. 【横川ダム】 令和6年度 国補 ダムメンテナンス(加速化) 工事

備考. 本見積書に、消費税は含まれません。

適格請求書発行事業者登録番号：T8030001069611

見積番号

御中

何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。



株式会社 電管エンジニアリング

電話 (0266) 53-1421(代)

F A X (0266) 53-1157

備 考 消費税は別途申し受けます。

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
撤去工	1	式		710,600
据付工	1	式		2,758,800
配線配管撤去工	1	式		1,170,400
配線配管工(材+工)	1	式		689,500
取水設備自動制御盤	1	式		85,200
常用放流設備機側操作盤	1	式		356,570
非常用放流設備機側操作盤	1	式		534,280
水位調整ゲート機側操作盤	1	式		172,980
外水位計	1	式		167,200
内水位計	1	式		167,200
諸経費	1	式		687,270
合 計				7,500,000

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額
撤去工		1	式		
取水設備		1	式		
取水ゲート機側操作盤		2	人	41,800	83,600
取水設備自動制御盤		2	人	41,800	83,600
放流設備		1	式		
常用放流設備機側操作盤		2	人	41,800	83,600
非常用放流設備機側操作盤		2	人	41,800	83,600
水位調整ゲート機側操作盤		5	人	41,800	209,000
水位計		1	式		
外水位計		2	人	41,800	83,600
内水位計		2	人	41,800	83,600
据付工		1	式		
取水設備		1	式		
取水ゲート機側操作盤		5	人	83,600	418,000
取水設備自動制御盤		5	人	83,600	418,000
放流設備		1	式		
常用放流設備機側操作盤		5	人	83,600	418,000
非常用放流設備機側操作盤		5	人	83,600	418,000
水位調整ゲート機側操作盤		5	人	83,600	418,000
水位計		1	式		
外水位計		4	人	83,600	334,400
内水位計		4	人	83,600	334,400
配線配管撤去工		1	式		
取水設備		12	人	41,800	501,600
放流設備		16	人	41,800	668,800
配線配管工(材+工)		1	式		
取水ゲート機側操作盤		1	式		
CV5.5*2-4本+IV8sq		2	m	640	1,280
CVV2sq*16C+IV8sq		2	m	1,540	3,080
CVV2sq*16C		2	m	1,310	2,620
CVV2sq*2C		6	m	160	960
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		5	m	510	2,550
CVV2sq*2C		5	m	160	800
CVV2sq*2C		6	m	160	960

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額
CVV2 s q *5C		3	m	340	1,020
CVV2sq*12C		4	m	790	3,160
CVV2 s q *5C		2	m	340	680
CVV2sq*12C		2	m	790	1,580
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		3	m	510	1,530
CVV2 s q *2C		3	m	160	480
電工		8	人	83,600	668,800
取水設備自動制御盤		1	式		
CV5.5*2-4本+IV8sq		0	m		
CVV2 s q *16C+IV8 s q		0	m		
CVV2 s q *16C		0	m		
CVV2 s q *2C		5	m	160	800
CVV2 s q *2C		5	m	160	800
凍結防止付属ケーブル		0	m		
電工		1	人	83,600	83,600
常用放流設備機側操作盤		1	式		
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		5	m	510	2,550
CVV2sq*36C		5	m	2,160	10,800
流量計付属①		0	m		
流量計付属②		0	m		
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		6	m	510	3,060
CVV2sq*12C		6	m	790	4,740
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		2	m	510	1,020
電工		4	人	83,600	334,400
非常用放流設備機側操作盤		1	式		
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		10	m	510	5,100
CVV2 s q *16C		10	m	1,310	13,100
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		8	m	510	4,080
CVV2 s q *12C		8	m	790	6,320
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		8	m	510	4,080
電工		6	人	83,600	501,600
水位調整ゲート機側操作盤		1	式		
CV3.5sq*3C+IV3.5sq		3	m	510	1,530
CVV2 s q *16C		3	m	1,310	3,930

内 訳 書

[illegible]

御見積書

株式会社 ヤマウラ

様

No. M637677/

2025年09月15日

ご照会の件につき下記の通り御見積り申し上げます。

件名： エンジニアリング事業部
(現場: 令和6年度国補ダムメンテナンス加速化)

御見積金額： ¥22,900 (消費税別途)

納期：

御支払条件： 月末締め翌月末現金

検収条件： 従来通り

見積有効期限：

営業担当：

備考： ※出庫時燃料満タンとなっております。
返却時燃料満タンにてお願いいたします。



TEL: 0265-85-3555 / FAX: 0265-85-4980



行	機材名	型式	数量	期間	単価	金額
1	4tユニック車 レンタル		1.00 台	1.00 日	21,000.00	21,000
2	補償料		1.00 台	1.00 日	900.00	900
3	基本管理料		1.00 台	1.00 回	1,000.00	1,000

御單価見積書

見積書No 21110

株式会社 ヤマウラ エンジニアリング事業部 御中

工 事 名 : 令和6年度 国補ダムメンテナンス(加速化)工事
工 事 場 所 : (一)横川川 上伊那郡辰野町 横川ダム
見 積 有 効 期 : 令和9年3月19日末
納 入 場 所 :
納 入 期 日 :
御 支 払 条 件 : お打ち合わせによる

〒399-4301 長野県上伊那郡富田村5339番地

株式会社イナツタ

代表取締役 永田 裕志

担当

[illegible]

備	考
---	---

施工体系図

発注者名	令和6年度 国補ダムメンテナンス(加速化)工事
工事名称	長野県 伊那建設事務所

工期	自 工事契約日より 至 令和9年 3月19日
----	---------------------------

元請名・事業者ID	株式会社 ヤマウラ
監督員名	-
監理技術者名	-
主任技術者名	-
監理技術者補佐名	-
専門技術者名	-
担当工事内容	-
専門技術者名	-
担当工事内容	-

元方安全衛生管理者	-
-----------	---

会長	統括安全衛生責任者
----	-----------

副会長	(株)ヤマウラ
-----	---------

横川ダム機側操作盤更新工事	会社名・事業者ID	(株)電管エンジニアリング	
	代表者名	[REDACTED] /	
	許可番号	知事 第11103号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定	
	安全衛生責任者	[REDACTED]	
	主任技術者	[REDACTED]	
	特定専門工事の該当	有	無
	専門技術者	[REDACTED]	
	担当工事内容	[REDACTED]	
工期	工事開始 ~ 令和9年 3月19日		

工 事	会社名・事業者ID	
	代表者名	
	許可番号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	特定専門工事の該当	有 ・ 無
	専門技術者	
	担当工事内 容	
工期	年 月 日 ~ 年 月	

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 の 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工 事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
工 事	担当工事内 容	
	工期	年 月 日 ～ 年 月 日

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
	担当工事内 容	
工期	年 月 日 ~ 年 月 日	

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工 事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
	担当工事 内 容	
工期	年 月 日 ～ 年 月 日	

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工 事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
工 事	担当工事内 容	
	工期	年 月 日 ～ 年 月

工 事	会社名・事業者ID	
	代表者名	
	許可番号	
	一般・特定の別	一般・特定
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	特定専門工事の該当	有・無
	専門技術者	
工 期	担当工事内容	
	年 月 日 ～ 年 月 日	

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
工 事	担当工事内 容	
	工期	年 月 日 ~ 年 月 日

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工 事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
工 事	担当工事内 容	
	工期	年 月 日 ～ 年 月 日

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
工 事	担当工事内 容	
	工期	年 月 日 ~ 年 月

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工 事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
工 期	担当工事内 容	
	年 月 日 ~ 年 月 日	

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工 事の該当	有
	専 門 技 術 者	
	担当工事内 容	
工期	年 月 日 ~ 年	

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工 事の核当	有 無
	専 門 技 術 者	
	担当工事内 容	
工期	年 月 日 ～ 年 月 日	

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主任技術者	
	特定専門工事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
	担当工事内 容	
工期	年 月 日 ~ 年 月	

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主 任 技 術 者	
	特定専門工 事の該当	有 ・ 無
	専 門 技 術 者	
工 事	担当工事 内 容	
	工期	年 月 日 ~ 年 月 日

工 事	会社名・事業者ID	
	代 表 者 名	
	許 可 番 号	
	一般 / 特定の別	一般 / 特定
	安全衛生責任者	
	主任技 術 者	
	特定専門工 事の該当	有
	専 門 技 術 者	
工 期	担当工事内 容	
	年 月 日 ~ 年 月 日	

施工体制台帳

[会社名・事業者ID] 株式会社ヤマウラ

[事業所名・現場ID] 令和6年度 国補ダムメンテナンス（加速化）工事 [-]

建設業の許可	許可業種	許可番号			許可（更新）年月日
	土・建・大・左・と・石・屋・ 電・管・タ・鋼・鉄・舗・塗・ 板・ガ・塗・防・内・機・熱・ 電通・造・建具・水・解	大 臣	特 定	2 第 9358 号	令和3年2月12日
	消防施設	大 臣	一 般	2 第 9358 号	令和3年2月12日

工事名称 及 工事内容	令和6年度 国補ダムメンテナンス（加速化）工事 横川ダム機側操作盤更新工事 1 式		
発注者名 及 住 所	長野県 伊那建設事務所 〒396-0025 長野県伊那市荒井3497		
工 期	自	工事契約日より	契 約 日
	至	令和 9 年 3 月 19 日	

契 約 所 営 業 所	区 分	名 称	住 所
	元請契約	株式会社ヤマウラ	長野県 駒ヶ根市 北町 22-1
	下請契約	株式会社ヤマウラ	長野県 駒ヶ根市 北町 22-1

健康保険等 の加入状況	保険加入 の有無	健康保険		厚生年金保険		雇用保険	
		☒ 加入	☐ 未加入 適用除外	☒ 加入	☐ 未加入 適用除外	☒ 加入	☐ 未加入 適用除外
	事業所 整理記号等	区分	営業所の名称	健康保険	厚生年金保険	雇用保険	
		元請契約	(株)ヤマウラ				
		下請契約	(株)ヤマウラ				

発注者の 監督員名		権限及び意見 申 出 方 法	
--------------	--	-------------------	--

監督員名	—	権限及び意見 申 出 方 法	工事下請負基本契約約款第12条 及び第17条記載の通り文章による
現 場 代 理 人 名		権限及び意見 申 出 方 法	工事請負契約書記載の通り文章による
監理技術者名 主任技術者名	☒ 専 任 ☐ 非専任	資 格 内 容	1級土木施工管理技士 番号
監理技術者 補 佐 名	—	資 格 内 容	—
専 門 技 術 者 名		専 門 技 術 者 名	
資 格 内 容		資 格 内 容	
担 当 工 事 内 容		担 当 工 事 内 容	

一号特定技能 外国人の従事の 状況（有無）	有 ☐ 無 ☒	外国人建設就労 者の従事の状況 （有無）	有 ☐ 無 ☒	外国人技能実習 生の従事の状況 （有無）	有 ☐ 無 ☒
-----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--

《下請負人に関する事項》

会社名・ 事業者ID	株式会社電管エンジニアリング []	代表者名	有賀 昭彦
住 所	〒392-0016 長野県諏訪市豊田1215-1 TEL 0266-53-1421		
工事名称 及 工事内容	令和6年度 国補ダムメンテナンス（加速化）工事 の内、現地工事 1式		
工 期	自 工事契約日より 至 令和 9 年 3 月 19 日	契 約 日	—

建設業の 許可	施工に必要な許可業種	許 可 番 号		許可（更新）年月日
	電気工事業 工事業	大臣 知事	特定 一般 第 11103 号	令和3年3月2日
	工事業	大臣 知事	特定 一般 第 号	

健康保険等 の加入状況	保険加入 の有無	健康保険 加入 未加入 適用除外	厚生年金保険 加入 未加入 適用除外	雇用保険 加入 未加入 適用除外	
	事業所 整理記号等	営業所の名称	健康保険	厚生年金保険	雇用保険
		株式会社電管エンジニアリング	■■■■■	■■■■■	■■■■■

現場代理人名	■■■■■
権限及び 意見申出方法	工事下請負基本契約約款記載の通り 文章による
主任技術者名	専 任 非 専 任 ■■■■■
資格内容	第一種電気工事士

安全衛生責任者名	■■■■■
安全衛生推進者名	■■■■■
雇用管理責任者名	■■■■■
専門技術者名	/
資格内容	
担当工事内容	

一号特定技能 外国人の従事の 状況（有無）	有 (無)	外国人建設就労 者の従事の 状況（有無）	有 (無)	外国人技能実 習生の従事の 状況（有無）	有 (無)
-----------------------------	-------	----------------------------	-------	----------------------------	-------

※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第14条の2第2項）

- ・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
- ・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
- ・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

・作業標準書

対象工程 制御盤据付調整	作成年月日 2021/11/26	改正年月日		
作業概要				
作業前打合せ→準備作業→搬入→据え付け→配線接続→試験調整→後片付・清掃→完成検査				
使用機材・工具 クレーン付きトラック、ベルトスリング、掃除機 充電式ハンマードリル、アンカー打ち込み工具、	必要資格・免許	小型移動式クレーン、玉掛け、 第二種電気工事士		
借用機器 なし				
使用材料 ステンレス オールアンカM16×4本				
保護具 保護帽、安全靴、防塵マスク、防塵眼鏡 保護手袋	作業人員 (1日)	現場監督者 1人 電 工 4人 輸 送 工 1人		
作業区分	作業手順	要点・急所		安全及び確認
作業前 打合せ (共通)	・健康チェックの実施 ・当日の作業予定 ・作業前のTBM/KYの実施（記録） ・図面、仕様書の確認	・体調不良者の就労。 ・新規入場者教育をしていない。 ・作業員が現場を理解していない。 ・作業分担がはっきりしない。		・体調不良者は作業しない。 ・新規入場者教育の実施。 ・作業に合った有資格者の確認チェック。 ・KYボードを活用して全員が参加してTBMを行う。災害事例の活用する。 ・作業分担、作業手順を全員で確認。
準備作業 (共通)	・安全掲示板の設置 ・場内立ち入り禁止処置 ・防保護具の使用前点検 ・工具の点検 ・使用機械の点検	・風雨による飛散。 ・第三者の立入り、災害。 ・服装、保護具が不適切。 ・不良品を使用で事故となる。 ・動作不良。		・バインド線等で強固に固定する。 ・ハリケードと明確な表示で管理する。 ・作業範囲に立ち入り禁止処置をする。 ・服装保護具の点検実施し不良品排除。 ・保護具は作業員分すべて確認する。 ・修理又は代替え品を用意し不良品は排除する。 ・修理又は代替え品を用意する。 ・再点検を実施する。
準備作業 (調査)	・既設調査を行う （搬入ルート、既設配線ルート、 入出力信号、据付検討、架空物 埋設物、制御内容、ブレーカ位置）	・服装、保護具が不適切。 ・段差につまずき転倒する。 ・充電部に触れ感電する。 ・誤信号を出力する。 ・装置を破損する。		・服装保護具の点検実施し不良品排除。 調査とあなどらない。 ・歩行時考え事をしない。 ・見えないところに手を入れない。 ・保護手袋の着用。 ・不用意に機器に触れない。 ・腕時計等の引っ掛ける可能性が有る物は事前に外す。

※以降手順は調査後変更の可能性があります。変更発生時は再度手順書を提出します。

作業区分	作業手順	要点・急所	安全及び確認
操作ロック (共通)	- ゲートと誤動防止の為、状態確認の実施 (ゲート状態、開度状態の確認) - 対象装置の電源を「断」にする	- ゲートを誤動作させる。 - 作業前状態が解らなくなる。 - 他設備の電源を誤って落とす。	- 写真、マーキングで管理する。 2人以上で確認を行う。1人に任せない。
輸送工 (共通)	トラック輸送(共通)	- 積荷重量オーバーで違反となる。 - 積荷姿が規制を超え違反となる。 - 積み荷が崩れて事故となる。 - 交通違反や不注意で事故となる。	- 制限重量を超えないようにする。 - 積荷姿は規制内に収める。 - 積荷の固定位置、締付力を適正にする。 - 交通ルール遵守し、慎重な運転をする。
装置搬入	- クレーン付きトラックで輸送車両から装置を下ろす - 据付位置まで台車運搬 - 仮置	- 吊り荷がバランスを崩し倒れる。 - クレーン旋回時作業者が挟まる。 - 台車が引っかかり荷が滑る。 - 他作業の邪魔になる。	- 地切り3, 3, 3運動の徹底。 - 介錯ロープを使用し、旋回時には作業者を配置しない。 - 荷締で装置と台車を固定する。 - 運搬路を事前確認し凹凸部、砂利を避ける。避けられない場合コンパネ養生。 - 作業場、通行帯、荷置場を分け作業する。
据付工	- あと施工アンカー打設 - 架台据付 - 筐体据付	- 寸法を間違える。 - 既存埋設物を破損する。 - 切子、粉塵が目、鼻に入る。 - 電動工具使用時に手首を燃る。 - アンカーが規定強度に達しない。 手、足を挟む。 - 固定が甘くなる。 - 水平、垂直が合わない。 手、足を挟む。 - 筐体が倒れる。 - 既設ケーブルを挟む。 - 固定が甘くなる。	- 図面を確認し、墨出しを行う - 埋設物調査を事前に実施しかぶり厚を確保する。 - マスク、メガネ、保護具着用徹底。 - 掃除機で即座に吸引する。 - 不安定な姿勢では使用しない。サイドハンドルを使用し両手で固定する。 - メーカーの施工手順を遵守する。 - 重量物に於いては複数名で運ぶ。 - トルクレンチを使用し既定値で締結する。締結後、合いマークをつける。 - 水平器を使用しライナーで調節する基礎との隙間が大きい場合(5mm程度)外面をシリコン補修する。 - 前後、左右に人員を配置し筐体の下へは手足を入れない。 - ケーブルは保護、養生し架台内に一時おさめる。 - トルクレンチを使用し既定値で締結する。締結後、合いマークをつける。

作業区分	作業手順	要点・急所	安全及び確認
	・配線接続 (既設線)	・充電箇所に触れ感電する。 ・既設端子が折れる。導通不良が起きる。 ・芯線同士を短絡させ、上位局に誤信号を出力する。 ・接続点を間違える。 ・カッターナイフで手を切る。 ・ケーブルをキンクさせる。	・作業前に断確認。保護カバー取付徹底。 ・端子部は流用せず圧着し直す。電源、信号共チューブを入れ絶縁性を高める。 ・芯線をむき出しにせず1本ずつ処理する。絶縁テープ、キャップで養生する。 ・図面を確認し接続する。手元の照度を保って確認する。 ・保護手袋を着用する。 ・ケーブルは伸ばして使用する。
試験調整工	・配線確認 ・装置電源 印加 ・動作試験 (自主/立会)	・機側機器を誤動作させる。 ・上位局に誤信号を出力する。 ・誤った場所を短絡する。 ・両端で間違った芯線を確認する。 ・印加電圧を間違え、機器を破損する。 ・回転部に巻き込まれる。 ・相回転方向を間違える。 ・遠隔操作時、第三者が機側機器に触れる。	・供給電源を断にして作業する。 ・絶縁テープ、キャップで養生する。 ・図面を確認し、機器内部回路が導通している部分は外す。 ・ヒューズ(0.3mA以下)付きジャンパー線を使用する。 ・携帯電話、トランシーブで連絡を密に取る。 ・ブレーカ投入は段階的に検電しながら実施する。 ※分電盤ブレーカ投入時は機器電源は”断”にして検電後、投入する。 ・試験開始前に作業者に声をかけ回転部付近の作業は避ける。 ・相回転計を使用し作業前後で確認する。 ・試験時には遠隔側にも人員を配置し動作前等連絡を密に取る。
後片付	・残材、発生部材は持ち帰る ・施工箇所周辺を清掃する ・機器状態確認	・残材、発生部材を散乱させる。 ・機器、周囲を汚したままにする。 ・故障が発生している。	・使いっぱなしにしない。都度保管場所へ戻す。 ・作業場所に限らず、周辺を清掃する。 ・原因箇所の究明後、監督員に報告し、指示を仰ぐ。

・作業標準書

対象工種 制御盤撤去	作成年月日 2021/11/26	改正年月日		
作業概要				
作業前打合せ→準備作業→配線解除・養生→機器撤去→基礎均し（モルタル削り）				
使用機材・工具 クレーン付きトラック、ベルトスリング	必要資格・免許		小型移動式クレーン、玉掛け、 第二種電気工事士	
借用機器 なし				
使用材料 なし				
保護具 保護帽、安全靴、防塵マスク、防塵眼鏡 保護手袋	作業人員 (1日)		現場監督者 1人 電 工 4人 輸 送 工 1人	
作業区分	作業手順	要 点 ・ 急 所		安全及び確認
作業前 打合せ (共通)	- 健康チェックの実施 - 当日の作業予定 - 作業前のTBM/KYの実施（記録） - 図面、仕様書の確認	- 体調不良者の就労。 - 新規入場者教育をしていない。 - 作業員が現場を理解していない。 - 作業分担がはっきりしない。		- 体調不良者は作業しない。 - 新規入場者教育の実施。 - 作業に合った有資格者の確認チェック。 - KYボードを活用して全員が参加してTBMを行う。災害事例の活用する。 - 作業分担、作業手順を全員で確認。
準備作業 (共通)	- 安全掲示板の設置 - 場内立ち入り禁止処置 - 防保護具の使用前点検 - 工具の点検 - 使用機械の点検	- 風雨による飛散。 - 第三者の立入り、災害。 - 服装、保護具が不適切。 - 不良品を使用で事故となる。 - 動作不良。		- バインド線等で強固に固定する。 - バリケードと明確な表示で管理する。 - 作業範囲に立ち入り禁止処置をする。 - 服装保護具の点検実施し不良品排除。 - 保護具は作業員分すべて確認する。 - 修理又は代替え品を用意し不良品は排除する。 - 修理又は代替え品を用意する。 - 再点検を実施する。
準備作業 (調査)	既設調査を行う (搬入ルート、既設配線ルート、 入出力信号、据付検討、架空物 埋設物、制御内容、ブレーカ位置)	- 服装、保護具が不適切。 - 段差につまずき転倒する。 - 充電部に触れ感電する。 - 誤信号を出力する。 - 装置を破損する。		- 服装保護具の点検実施し不良品排除。 調査とあなどらない。 - 歩行時考え事をしない。 - 見えないところに手を入れない。 - 保護手袋の着用。 - 不用意に機器に触れない。 - 腕時計等の引っ掛ける可能性が有る物は事前に外す。

※以降手順は調査後変更の可能性があります。変更発生時は再度手順書を提出します。

作業区分	作業手順	要点・急所	安全及び確認
操作ロック (共通)	・ゲートと誤動防止の為、状態確認の実施 (ゲート状態、開度状態の確認) ・対象装置の電源を「断」にする	・ゲートを誤動作させる。 ・作業前状態が解らなくなる。 ・他設備の電源を誤って落とす。	・写真、マーキングで管理する。 ・2人以上で確認を行う。1人に任せない。
輸送工 (共通)	・トラック輸送(共通)	・積荷重量オーバーで違反となる。 ・積荷姿が規制を超え違反となる。 ・積み荷が崩れて事故となる。 ・交通違反や不注意で事故となる。	・制限重量を超えないようにする。 ・積荷姿は規制内に収める。 ・積荷の固定位置、締付力を適正にする。 ・交通ルール遵守し、慎重な運転をする。
配線解除 (共通)	・解線前に電源線、信号線それぞれにマーキングを実施します ・受電部は前項で電源「断」していますが確認で検電します ・マーキングを確認しながら芯線同士が短絡しないよう解線を行いケーブル養生します	・つなぎ順序が不明になる。 ・充電部に触れ感電する。 ・工具で手を切る。 ・芯線を短絡させ誤信号を出力する。	・解線前のマーキング確認の徹底。 ・入力電圧が印加している場合、原因究明を実施するとともに手順「操作ロック」に戻る。 ・基本的に手袋着用を義務化し、刃物使用時は刃先方向を意識し使う。 ・解線後は芯線ごとにテープ養生して保管する。
装置搬出	・架台と筐体間の縫いボルトを外し筐体を倒す【自動制御装置】 ・機器架台を外す【自動制御装置】 ・パネルを外す【遠隔操作装置】 ・クレーンの届く範囲まで台車手運搬する ・クレーン付きトラックで輸送車両に積む	・筐体を倒す際、作業者が下敷きになる。 ・吊り荷がバランスを崩し倒れる。 ・クレーン旋回時作業者が挟まる。 ・台車が引っかかり荷が滑る。 ・他作業の邪魔になる。	・声を掛け合い力を合わせる。 ・適正な人数を配置する。55kg以下/1人 ・地切り3, 3, 3運動の徹底。 ・介錯ロープを使用し、旋回時には作業者を配置しない。 ・荷締で装置と台車を固定する。 ・運搬路を事前確認し凹凸部、砂利を避ける。避けられない場合コンパネ養生。 ・作業場、通行帯、荷置場を分け作業する。
基礎削り 【自動制御装置】	・既存基礎と架台間の詰め物（モルタル）を除去する	・電動工具で手首を擦る。 ・粉塵が目鼻口に入る。 ・発生品を散乱させる。	・サイドハンドルを掴み両手で固定する。不安定な姿勢では使用しない。 ・作業時はメガネ、マスク、手袋の着用を徹底する。 ・発生品は袋にまとめ保管する。

作業区分	作業手順	要点・急所	安全及び確認
産業廃棄物 運搬/処理 (共通)	・現場発生品を処理施設にて処分する。運搬については自社で実施予定 (コンクリート塊・金属くず)	・積荷重量オーバーで違反となる。 ・積荷姿が規制を超え違反となる。 ・積み荷が崩れて事故となる。 ・交通違反や不注意で事故となる。 ・許可品目外の発生品を持ち込む。 ・途中で不法投棄する。	・制限重量を超えないようにする。 ・積荷姿は規制内に収める。 ・積荷の固定位置、締付力を適正にする。 ・交通ルール遵守し、慎重な運転をする。 ・計画時に処分許可証を十分確認する。 ・現場出発時、処理場搬入時の双方で荷姿を写真管理し変化がないことを確認する。
後片付 (共通)	・残材、発生部材は持ち帰る ・施工箇所周辺を清掃する ・機器状態確認	・残材、発生部材を散乱させる。 ・機器、周囲を汚したままにする。 ・故障が発生している。	・使いつばなしにしない。都度保管場所へ戻す。 ・作業場所に限らず、周辺を清掃する。 ・原因箇所の究明後、監督員に報告し、指示を仰ぐ。


調査項目③

手持ち公共工事の状況

発注者名	工事名	工事箇所名	工期	技術者氏名	備考
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和元年度 与田切川上流地点発電所建設工事	上伊那郡飯島町七久保ほか	2020/03/19 ～ 2025/12/26	■■■■■■■■■■	JV工事
長野県企業局 中央制御所	令和3年度 次世代運転監視制御ネットワーク構築事業	長野県長野市 川中島町四ツ屋ほか	2021/11/02 ～ 2026/03/31	■■■■■■■■■■	JV工事
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和6年度 中田切川地点発電所建設事業	駒ヶ根市赤穂	2024/03/29 ～ 2028/07/31	■■■■■■■■■■	JV工事
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和6年度 奈良井発電所大規模改修工事	長野県塩尻市大字奈良井	2024/09/11 ～ 2028/08/31	■■■■■■■■■■	
長野県上伊那地域振興局	令和6年度 県単緊急農地防災事業 西天竜地区 西天竜頭首工ゲート改修工事	岡谷市川岸	2025/01/21 ～ 2025/11/28	■■■■■■■■■■	
長野県企業局電気事業課	令和6年度 美和発電所大規模改修工事に 伴う地域共生促進事業	伊那市長谷非持	2025/01/23 ～ 2026/01/27	■■■■■■■■■■	
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和7年度 大鹿発電所 御所平・小波川 取水口自動制御装置修繕	下伊那郡大鹿村大河原	2025/07/30 ～ 2026/02/18	■■■■■■■■■■	
長野県松本地域振興局	令和7年度 県営かんがい排水事業 須砂渡地区 水門製作据付工事	安曇野市堀金烏川	2025/07/30 ～ 2026/08/18	■■■■■■■■■■	

調査項目④

契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連（地理的条件）

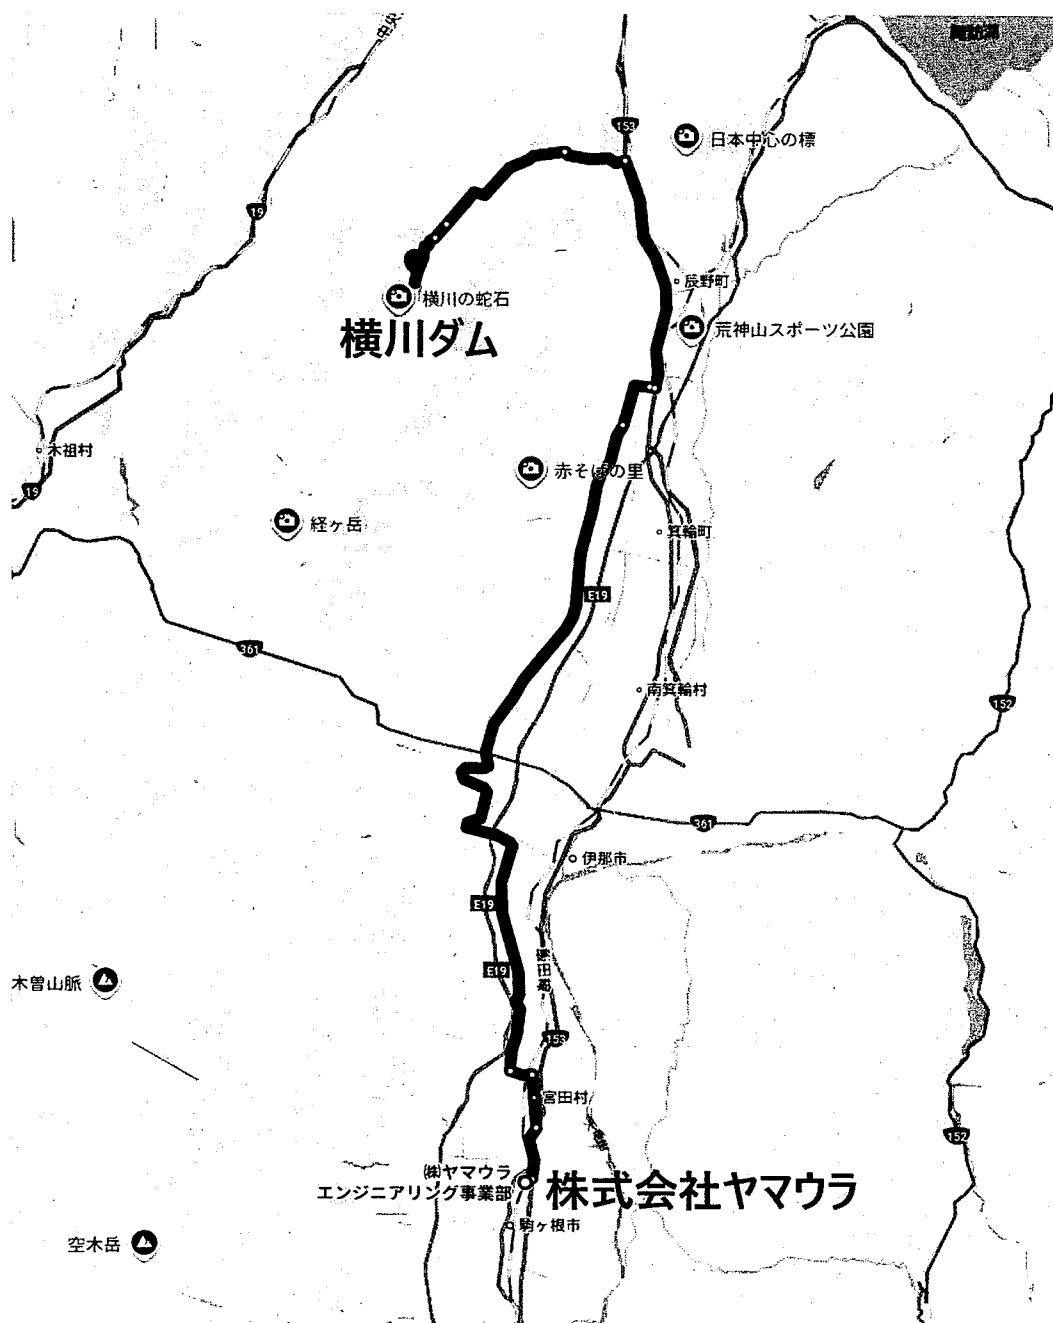

株式会社ヤマウラ エンジニアリング事業部
長野県駒ヶ根市東町19番16号

工事箇所（横川ダム）まで約45km 所要時間 約1時間

調査項目⑤

手持ち資材の状況及び手持ち機械の状況

[illegible]

資材購入先および購入先と入札者との関連

[illegible]

調査項目⑦

建設副産物の処理方法と処理先

[illegible]

技術者及び労働者の保有と配置計画

技術者リスト

資格名	氏名	配置状況
一級土木施工管理技士	[REDACTED]	別工事に配置済み
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	本工事に配置予定
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	別工事に配置済み
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	別工事に配置済み
//	[REDACTED]	別工事に配置済み
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	
//	[REDACTED]	

資格名	氏名	配置状況
一級電気工事施工管理技士	██████████	
〃	██████████	
〃	██████████	
〃	██████████	別工事に配置済み
〃	██████████	
〃	██████████	
〃	██████████	別工事に配置済み
〃	██████████	
〃	██████████	
〃	██████████	
〃	██████████	
〃	██████████	
〃	██████████	



調査項目⑨ー 1
過去に施工した公共工事名及び発注者

令和5年度

発注者名	工事名	施工場所	請負金額	着工	竣工	コリス番号
長野県 須坂建設事務所	令和4年度 国補ダムメンテナンス(加速化)工事	(一) 灰野川 須坂市 豊丘ダム (3)	137,467,000	2023/05/17	2025/8/8	4052265977
長野県 長野地域振興局	令和5年度 県営農村地域防災減災事業 千曲川沿岸清野地区 除塵機製作据付工事	長野市篠ノ井東福寺	81,620,000	2023/7/14	2024/3/22	4052982159
大町市	令和5年度 自然エネルギー活用推進事業 町川発電所 水車カバー修繕工事	大町市社3595番地11	23,650,000	2023/10/13	2024/3/31	4054165098
長野県埴科郡坂城町	令和5年度 無停電電源装置設置工事	坂城町大字坂城	16,720,000	2023/11/7	2024/6/28	4054406567
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和5年度 くだもの里まつかわ発電所 水車軸受緊急修繕	下伊那郡松川町上片桐	2,497,000	2024/3/15	2024/3/29	-
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和5年度 小渋えんまん発電所 水車発電機修繕	下伊那郡松川町生田	1,870,000	2024/1/23	2024/3/19	-
駒ヶ根市	令和5年度 公共下水道事業駒ヶ根浄化センター 脱 水ケーキ貯留ホッパー露受け取替え工事	駒ヶ根市 下平4569番地	2,860,000	2023/12/14	2024/3/27	-
令和5年度計：受注件数7件 請負金額合計 266,684,000円			266,684,000			

令和6年度

発注者名	工事名	施工場所	請負金額	着工	竣工	コリス番号
長野県企業局 南信発 電管理事務所	令和6年度 小渋えんまん発電所 水車軸受緊急修繕工事	下伊那郡松川町生田	11,858,000	2024/6/27	2024/10/31	4056301330
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和6年度 くだもの里まつかわ発電所 水車緊急分解点検	下伊那郡松川町上片桐	2,497,000	2024/7/29	2024/10/31	-
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和6年度 与田切発電所 水圧鉄管緊急修繕	上伊那郡飯島町七久保	436,700	2024/8/1	2024/8/30	-
独立行政法人水資源機 構 味噌川ダム管理所	バルブ室Wi-Fi設備設置外工事	長野県木曽郡木祖村大字 小木曽地内	825,000	2025/2/28	2025/3/25	-
令和6年度計：受注件数4件 請負金額合計 15,616,700円			15,616,700			

令和7年度

発注者名	工事名	施工場所	請負金額	着工	竣工	コリス番号
長野県企業局 南信発電管理事務所	令和7年度 高遠ダム右岸ゲート開度計緊急修繕	伊那市高遠町東高遠	363,000	2025/7/1	2025/8/29	-
令和7年度計：受注件数1件 請負金額合計 363,000円			363,000			

調査項目⑨ー2

過去に低入札価格調査の対象となった工事名

発注者名	工事名	施工場所	請負金額	着工	竣工	コリス番号
長野県 北信地方事務所	平成22年度 基幹水利施設ストックマネジメント事業 木島地区水門補修工事	飯山市大字木島	20,265,000	2011/3/14	2012/3/23	4007736321
長野県企業局 南信発電管理事務所	平成29年度 小渋第2発電所 上水槽排砂門改良工事	下伊那郡松川町生田 ほか1箇所	7,192,800	2018/1/5	2018/3/23	4032584011
独立行政法人水資源 機構草木ダム管理所	草木ダム非常用放水設備整備工事	群馬県みどり市東町 座間地区	46,926,000	2018/5/11	2019/3/15	4033553903
長野県 須坂建設事務所	令和4年度 国補ダムメンテナンス(加速化)工事	(一) 灰野川 須坂市 豊丘ダム(3)	137,467,000	2023/05/1	2025/8/8	4052265977

調査項目⑩

建設業法施行規則第4条、第10条、第19条の3に該当する以下の様式。

- ・様式15号 貸借対照表
- ・様式16号 損益計算表
- ・様式17号 株主資本等変動計算書

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(会社名) 株式会社ヤマウラ

資 産 の 部

単位：千円

I 流 動 資 産

現金預金	11,700,498
受取手形	8,479
完成工事未収入金	6,745,468
電子記録債権	727,177
未成工事支出金	1,555,465
材料貯蔵品	40,979
短期貸付金	0
前払費用	31,736
その他	670,972
貸倒引当金	△ 0
流動資産合計	21,480,778

II 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

建物・構築物	4,151,733
減価償却累計額	△ 3,089,710
機械・運搬具	2,112,335
減価償却累計額	△ 1,611,623
工具器具・備品	369,520
減価償却累計額	△ 286,916
土地	1,262,648
リース資産	
減価償却累計額	△

建設仮勘定		181,082
その他	0	
減価償却累計額	Δ 0	0
有形固定資産合計		3,089,070
(2) 無形固定資産		
特許権		0
借地権		26,523
のれん		0
リース資産		0
その他		13,617
無形固定資産合計		40,140
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券		2,209,153
関係会社株式・関係会社出資金		0
長期貸付金		4,829,693
破産更生債権等		170
長期前払費用		12,825
繰延税金資産		115,591
その他		223,590
貸倒引当金	Δ	1,653,732
投資その他の資産合計		5,737,292
固定資産合計		8,896,503
III 繰延資産		
創立費		0
開業費		0
株式交付費		0
社債発行費		0
開発費		0
繰延資産合計		0
資産合計		30,377,282

負債の部

I 流動負債

支払手形	0
工事未払金	2,431,106
短期借入金	0
リース債務	0
未払金	389,494
未払費用	213,629
未払法人税等	338,494
未成工事受入金	2,548,773
賞与引当金	579,000
工事損失引当金	0
完成工事補償引当金	68,175
その他	452,357
流動負債合計	7,021,031

II 固定負債

社債	0
長期借入金	0
長期未払金	24,139
資産除去債務	13,155
退職給付引当金	39,657
負ののれん	0
その他	61,815
固定負債合計	138,767
負債合計	7,159,799

純 資 産 の 部

I 株主資本

(1) 資本金	2,888,492
(2) 新株式申込証拠金	0
(3) 資本剰余金	
資本準備金	1,995,602
その他資本剰余金	0
資本剰余金合計	1,995,602
(4) 利益剰余金	
利益準備金	169,832
その他利益剰余金	
別途積立金	3,460,000
固定資産圧縮積立金	36,961
√ 繰越利益剰余金	14,544,102
利益剰余金合計	18,210,895
(5) 自己株式	△ 831,160
(6) 自己株式申込証拠金	0
株主資本合計	22,263,830

II 評価・換算差額等

(1) その他有価証券評価差額金	953,652
(2) 繰延ヘッジ損益	0
(3) 土地再評価差額金	0
評価・換算差額等合計	953,652

III 新株予約権

新株予約権	0
純資産合計	23,217,482
負債純資産合計	30,377,282

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

（会社名）株式会社ヤマウラ

単位：千円

I	売上高		
	完成工事高	32,641,888	
	兼業事業売上高	287,916	32,929,804
II	売上原価		
	完成工事原価	26,051,298	
	兼業事業売上原価	126,347	26,177,646
	売上総利益（売上総損失）		
	完成工事総利益（完成工事総損失）	6,590,589	
	兼業事業総利益（兼業事業総損失）	161,568	6,752,158
III	販売費及び一般管理費		
	役員報酬	202,493	
	従業員給料手当	1,063,433	
	退職金	19,107	
	法定福利費	199,333	
	福利厚生費	44,550	
	修繕維持費	9,319	
	事務用品費	39,059	
	通信交通費	45,281	
	動力用水光熱費	53,924	
	調査研究費	48,925	
	広告宣伝費	143,013	
	株主優待引当金繰入額	163,274	
	支払手数料	288,021	
	交際費	50,922	
	寄付金	12,441	
	地代家賃	61,011	
	減価償却費	148,260	
	賃借料	43,947	
	租税公課	163,431	
	保険料	88,367	
	雑 費	113,195	3,001,314
	営業利益（営業損失）		3,750,843

IV	営業外収益		
	受取利息及び配当金	<u>71,407</u>	
	その他	<u>19,900</u>	<u>91,308</u>
V	営業外費用		
	支払利息	<u>267</u>	
	見し株式取得費用	<u>0</u>	
	貸倒損失	<u>0</u>	
	その他	<u>9,430</u>	<u>9,697</u>
✓	経常利益（経常損失）		<u>3,832,454</u>
VI	特別利益		
	固定資産売却益	<u>6,234</u>	
	その他	<u>141,467</u>	<u>147,702</u>
VII	特別損失		
	固定資産売却損	<u>0</u>	
	その他	<u>204</u>	<u>204</u>
	税引前当期純利益（税引前当期純損失）		<u>3,979,951</u>
	法人税、住民税及び事業税	<u>982,660</u>	
	法人税等調整額	<u>-5,105</u>	<u>977,555</u>
	当期純利益（当期純損失）		<u>3,002,397</u>

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日
(会社名) 株式会社ヤマウラ

単位：千円

	株主資本										評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金					自己 株式	株主 資本 合計	その他 有価証 券評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益	土地 再評価 差額金			評価・ 換算 差額等 合計
		新株式 申込証 拠金	資本剰余金		利益 準備金	その他利益剰余金			利益 剰余金 合計								
			資本 準備金	その他 資本 剰余金		資本 剰余金 合計	別途 積立金	固定資 産圧縮 積立金									
当期首残高	2,888,492	0	1,995,602		1,995,602	169,832	3,460,000	38,408	11,824,166	15,492,406	-831,158	19,545,342	952,592		952,592	20,497,934	
当期変動額																	
新株の発行																	
剰余金の配当									-283,908	-283,908		-283,908				-283,908	
当期純利益									3,002,397	3,002,397		3,002,397				3,002,397	
自己株式の処分											-1	-1				-1	
固定資産圧縮積立金 の取崩								-1,447	1,447	0		0				0	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)													1,060		1,060	1,060	
当期変動額合計							0	-1,447	2,719,936	2,718,489	-1	2,718,488	1,060		1,060	2,719,548	
当期末残高	2,888,492	0	1,995,602		1,995,602	169,832	3,460,000	36,961	14,544,102	18,210,895	-831,160	22,263,830	953,652		953,652	23,217,482	
